



แนวทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๒ สำนักงานทางหลวงที่ ๕

สัญญาที่ อต.๒/ม.๒/๔/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓
ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ระหว่าง กม.๑๒+๒๖๓ - กม.๑๗+๐๐๐
ปริมาณงาน ๓๔,๙๕๙ ตร.ม.

ระหว่าง

กรมทางหลวง โดย แนวทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๒

กับ

บริษัท แทร์คโก้ จำกัด

วันเริ่มสัญญา ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖

ระยะเวลาทำการ ๖๐ วัน

ค่างานตามสัญญา ๑๔,๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ค่าปรับตามสัญญาวันละ ๓๖,๐๕๐.๐๐ บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ๑. นายสุวิพุธ ดันตะโยธิน | รต.ทล.๕.๑ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายบัณฑิต รักษาดี | ผอ.ขท. อุดรดิตถ์ที่ ๒ | กรรมการ |
| ๓. นายชาญชัย สลิวงค์ | รท.ขท.อุดรดิตถ์ที่ ๒ (ป) | กรรมการ |
| ๒. นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพริ้ว | วพ.ทล.๕ | กรรมการ |
| ๓. นายศรัณย์ ชุ่มกลัด | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

ผู้ควบคุมงาน

| | | |
|------------------|----------------------|--------------|
| ๑. นายบัญชา มะโน | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | ผู้ควบคุมงาน |
|------------------|----------------------|--------------|

บันทึกการทําสัญญา

พ.๑-๐๕

กรมทางหลวง

เริ่มใช้ ๑๙ ธ.ค. ๕๕

สัญญาที่ อต.๒/ม.๒/๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

- ชื่อผู้รับจ้าง หรือ ผู้ชาย บริษัท แพร์โก้ จำกัด โดย นายวงศ์ วงศ์วรกุล
- ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงอุดรดิศต์ที่ ๒
- ชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผส.ทล.๕ อนุมัติเมื่อ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕
- จ้าง โดยวิธี ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
- ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
โครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา กิจกรรม บำรุงรักษาทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ห้วยน้อยกา - เค้นชาติ ระหว่าง กม.๑๒+๒๖๓ - กม.๑๗+๐๐๐
ปริมาณงาน ๓๔.๙๕๙ ตร.ม. จำนวน ๑๕,๐๐๐.๐๐๐.๐๐ บาท
ได้รับใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเลขที่ GF.๑๐๒๓๗/๒๕๖๖/๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ราคาคิดเป็นหน่วยละ — บาท รวมค่างาน ๑๕,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า ๑๕% เป็นเงิน ๒,๓๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท
- เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ — ลงวันที่ —
- คร.ม.อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. — ถึง พ.ศ. — ตามหนังสือ
เลขที่ — ลงวันที่ — วงเงิน — บาท
- เงินประกันสัญญา ๗๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท โดย
 เงินสด — บาท
 เชื่อกนาคกร — เลขที่ — ลงวันที่ —
 หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ ๔๗๕๐๒๒๑๑๑๑๐๒๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
 อื่น ๆ —
- เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐%
- ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๓๖,๐๕๐.๐๐ บาท
 ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ — % ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
- วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ (ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน)

ลงชื่อ  ผู้บันทึก
(นางสาวปรานอม แต่งสุวรรณ)

ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ

ทะเบียนรายการเอกสารประกอบการทำสัญญา

สัญญาที่ อต.๒/ม.๒/๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ระหว่างกรมทางหลวง โดย นายบัณฑิต รักษาดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ ๒
ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง

ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท แทร์ค็อก จำกัด โดย นายวงศ์ วงศ์วรกุล

ผู้รับจ้างในการจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๑๐ ตอน ห้วยน้อยภา-
เด่นชาติ ระหว่าง กม.๑๒+๒๖๓ - กม.๑๗+๐๐๐ ปริมาณงาน ๓๔,๙๕๙ ตร.ม.

ซึ่งได้ลงนามสัญญาไว้ต่อกัน เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ในวันทำสัญญาดังกล่าวมีเอกสารประกอบการทำสัญญา ดังนี้-

- | | |
|--|------------------------------|
| ๑. บันทึกรายการทำสัญญา | จำนวน <u>๑</u> หน้า |
| ๒. หนังสือคำประกันธนาคาร | จำนวน <u>๑</u> หน้า |
| ๓. หนังสือมอบอำนาจ | จำนวน <u>๑</u> หน้า |
| ๔. เอกสารการรับรองของทางราชการ | จำนวน <u> </u> หน้า |
| ๕. สัญญาจ้าง | จำนวน <u>๑๒</u> หน้า |
| ๖. ข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง | จำนวน <u>-</u> หน้า |
| ๗. รายละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงินและสูตรการปรับราคา | จำนวน <u>๘</u> หน้า |
| ๘. ข้อกำหนด หรือมาตรฐาน | จำนวน <u>๕</u> ชุด |
| ๙. แบบรูป | จำนวน <u>๙</u> หน้า |
| ๑๐. ใบแจ้งปริมาณงานและราคา | จำนวน <u>๑</u> หน้า |
| ๑๑. หนังสือ บริษัทฯ ขอปรับราคาและใบแจ้งปริมาณงานและราคา (บัญชีรายการก่อสร้าง ซึ่งรวมราคาค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว | จำนวน <u>๒</u> หน้า |

ได้จัดเอกสารดังกล่าวแนบเรื่องไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการทำสัญญา
(นางสาวณัฐชา เกตุสด)

ตรวจสอบแล้วเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ)  พท.ชท.อุดรดิตต์ที่ ๒
(นางสาวณัฐชา เกตุสด)

(ลงชื่อ)  รอ.ชท.อุดรดิตต์ที่ ๒ (บ)
(นางสาวปรานอม แต่งสุวรรณ)

(ลงชื่อ)  ผอ.ชท.รักษาราชการแทน
(นายบัณฑิต รักษาดี) ผอ.ชท.อุดรดิตต์ที่ ๒

(สำเนา)

หนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (หลักประกันสัญญา)

เลขที่ 475022111100270

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), 0107536000102 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 9
รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ กรมทางหลวง โดย
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2,0806ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ บริษัท แทร็คโก้ จำกัด, 0545532000170 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง" ได้ทำ
สัญญาซื้อขาย/จ้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1083
ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ระหว่าง กม.12+263 - กม.17+000 ปริมาณงาน 34,959 ตร.ม.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์, 65097247695 กับผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้างตามสัญญา เลขที่ อต.2/ม.2/4/2566 ลงวันที่ 16
พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ขาย/ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวน
เงิน -721,000.00- บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ -5.00- (ร้อยละ ห้า) ของมูลค่า
ทั้งหมดตามสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้
ซื้อ/ผู้ว่าจ้างจำนวนไม่เกิน -721,000.00- บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ใน
กรณีที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้ขาย/ผู้รับจ้างมิได้
ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้
ขาย/ผู้รับจ้างชำระหนี้ดังกล่าว

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาซื้อขาย/จ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 (ระบุนวันที่ครบกำหนดรวมกับระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องด้วย) และ
ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ
ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับ
จ้างดังกล่าวข้างต้น


(นายบัณฑิต รักษาดี)
ผอ.ขท.อุดรธานีที่ ๒

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน),
0107536000102



**เอกสารฉบับนี้จัดพิมพ์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ให้เป็นหลักฐานได้ตามกฎหมาย โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อด้วยปาก**

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ อต.๒/ม.๒/๔/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ ๒ ตำบล/แขวง จีวังม อำเภอ/เขต เมืองอุดรดิตต์ จังหวัดอุดรดิตต์ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ ๒ โดย นายบัณฑิต รักษาดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ ๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท แทร็คโก้ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดแพร่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๖๘/๒ ถนนยันตรกิจโกศล ตำบล/แขวง ในเวียง อำเภอ/เขต เมืองแพร่ จังหวัด แพร่ โดยนายวงค์วงศ์วรกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดแพร่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ พร.๐๐๑๐๓๘ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้มอบอำนาจให้ นายจิรศักดิ์ สุวรรณเดช ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน งานจ้างเหมาะทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ระหว่าง กม.๑๒+๒๖๓ - กม.๑๗+๐๐๐ ปริมาณงาน ๓๔,๔๕๔ ตร.ม. ณ ตำบลบ่อเปี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรดิตต์


ตำบล/แขวง บ่อเปี้ย อำเภอ/เขต บ้านโคก จังหวัด อุดรดิตต์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้


ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | | | |
|-----|--------|---|--------------|
| ๒.๑ | ผนวก ๑ | แบบรูป | จำนวน ๔ หน้า |
| ๒.๒ | ผนวก ๒ | ใบแจ้งปริมาณงานและราคา | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒.๓ | ผนวก ๓ | หนังสือ บริษัทฯ ขอปรับลดราคา และใบแจ้งปริมาณงานและราคา (บัญชีรายการก่อสร้าง ซึ่งรวมราคาค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว | จำนวน ๒ หน้า |
| ๒.๔ | ผนวก ๔ | หลักเกณฑ์การพิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา | จำนวน ๑ หน้า |



ผู้ว่าจ้าง



ผู้รับจ้าง


| | | | |
|------|---------|--|--------------|
| ๒.๕ | ผนวก ๕ | รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง หรือความเสียหายภายในกำหนดเวลา | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒.๖ | ผนวก ๖ | รายละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงินและสูตรการปรับราคา | จำนวน ๘ หน้า |
| ๒.๗ | ผนวก ๗ | รายละเอียดต่อท้ายสัญญา | จำนวน ๒ หน้า |
| ๒.๘ | ผนวก ๘ | เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒.๙ | ผนวก ๙ | รายการละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง | จำนวน ๑ เล่ม |
| ๒.๑๐ | ผนวก ๑๐ | แบบแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒.๑๑ | ผนวก ๑๑ | แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ งานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑) | จำนวน ๑ เล่ม |
| ๒.๑๒ | ผนวก ๑๒ | คู่มือเครื่องหมายควบคุมจราจรในงานก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ | จำนวน ๑ เล่ม |
| ๒.๑๓ | ผนวก ๑๓ | เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒.๑๔ | ผนวก ๑๔ | มาตรฐานที่ ทล.-ม.๔๐๓/๒๕๓๑ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๑๕ | ผนวก ๑๕ | มาตรฐานที่ ทล.-ม.๔๐๘/๒๕๓๒ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๑๖ | ผนวก ๑๖ | ข้อกำหนดที่ ทล.ก.๖๐๔/๒๕๒๕ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑.๑๗ | ผนวก ๑๗ | มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุเทอร์โมพลาสติก สະທ້ອនສຳລັບທຳເຄື່ອງໝາຍບນຜືວາງ มอก.๕๔๒ - ๒๕๔๙ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑.๑๘ | ผนวก ๑๘ | คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างงานทาง งานสะพาน และงานบำรุงทาง ของกรมทางหลวง | จำนวน ๑ ชุด |


ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๔๗๕๐๒๒๑๑๑๑๐๐๒๗๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๗๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ


.....
ผู้ว่าจ้าง


.....
ผู้รับจ้าง

บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบชำระครบถ้วนตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบที่พึงปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๔,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๙๔๓,๓๖๔.๔๙ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ ตามรายการ แต่ละประเภท ดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓

คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ต่างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคานี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมาก หรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง ตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ต่างตกลง ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย หรือเรียกกร้องค่าสินไหมทดแทน อันเกิดจาก การที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการ ได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงาน ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงาน ที่ทำเสร็จจริง ในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคาจะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชย เป็นค่า overhead และ mobilization สำหรับงานรายการ นั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่าง ระหว่างปริมาณงานทั้งหมด ของงานรายการนั้น ตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง คูณด้วย ราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า

.....
ผู้ว่าจ้าง

.....
ผู้รับจ้าง

overhead และ mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการทำงานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างอาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้าง ตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นรายเดือน ตามเงื่อนไขงานที่ทำเสร็จจริง เมื่อ ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงาน ที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ ตรงตามข้อกำหนด แห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้าง จะออกหนังสือรับรอง การรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้าย จะจ่ายให้ เมื่องานทั้งหมด ตามสัญญา ได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาแพรว ชื่อบัญชี บริษัท แทร็คโก้ จำกัด เลขที่บัญชี ๕๐๖๖๐๔๒๙๖๒ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี)ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒,๑๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้าบาทถ้วน) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เพิ่มเติมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน (สิบห้า) ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

.....
ผู้ว่าจ้าง


.....
ผู้รับจ้าง

๕.๓ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน ทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้วผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงิน จำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า - เดือน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือจำนวนบาท (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือ หนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย


.....
ผู้ว่าจ้าง


.....
ผู้รับจ้าง

TRACKO

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า


.....
ผู้ว่าจ้าง


.....
ผู้รับจ้าง

TRACKING

จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ (สิบสอง) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น


ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้


.....
ผู้ว่าจ้าง


.....
ผู้รับจ้าง

แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง


ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดให้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด


.....
ผู้ว่าจ้าง


.....

ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓๖,๐๕๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-..... บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา ดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

.....
.....

ผู้ว่าจ้าง

TRACKO
.....
.....

ผู้รับจ้าง

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี


ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำเข้าของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับการอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของ


.....
ผู้ว่าจ้าง


.....
ผู้รับจ้าง

ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือหรือผู้มีวุฒิปับัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างก่อสร้าง


๒๓.๒ ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปับัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๖


.....
ผู้ว่าจ้าง


.....
ผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายบัณฑิต รักษาดี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายจිරศักดิ์ สุวรรณเดช)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปรานอม แดงสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวณัฐชา เกตุสด)

เลขที่โครงการ ๖๕๐๙๗๒๔๗๖๙๕

เลขคู่สัญญา ๖๕๑๑๒๒๐๐๖๒๘๘

TRACKO
COMPANY LIMITED

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปีงบประมาณ 2566

รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ



กม12+263.000 - กม17+000.000

ระยะทาง 4.737 กม

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

| | | |
|-------------|------------|--------|
| แขวงทางหลวง | รหัสควบคุม | แผนที่ |
| จุดตัดที่ 2 | 0100 | A |

TITLE SHEET & R.O.W.
ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100
ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ
กม12+263.000 - กม17+000.000

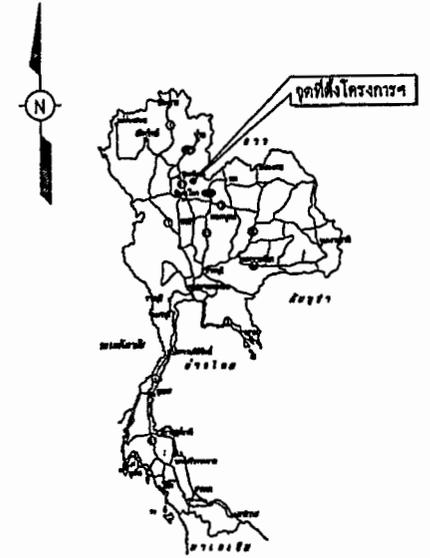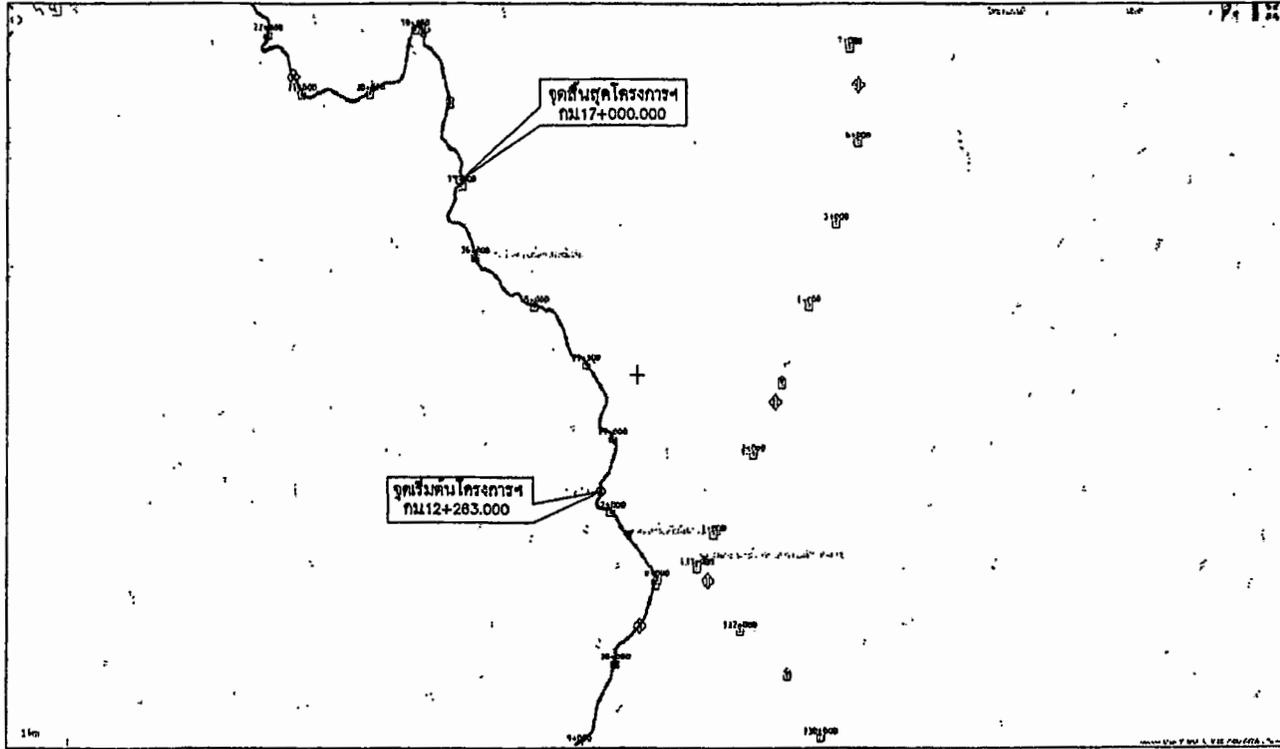

NOT TO SCALE

ผู้ร่าง
ผู้รับจ้าง
บัญชีเขตทาง

TRACKS

| กม - กม | เขตทางเดิม (เมตร) | | เขตทางที่ประสงค์ (เมตร) | | หมายเหตุ |
|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------|--------|----------|
| | ซ้ายทาง | ขวาทาง | ซ้ายทาง | ขวาทาง | |
| กม12+263.000-กม17+000.000 | 15.00 | 15.00 | - | - | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| กรมทางหลวง | | | |
|-----------------------|-----------------|------------|--|
| เขียน ทวีรัตน์ | ทวน | Bar | |
| ออกแบบ <i>Mr. May</i> | ตรวจ <i>May</i> | รท.ว.ทล.5 | |
| เห็นชอบ | <i>OK</i> | 29/ค.ค./65 | |
| อนุมัติ | <i>W. D...</i> | 29/ค.ค./65 | |

| สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) | | |
|--|---------|--------|
| แขวงทางหลวง | รหัสกรม | แผนที่ |
| อุทกคดีที่ 2 | 0100 | B1 |
| ข้อกำหนดทั่วไป ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยซอกา - เตนชาติ กม.12+263.000 - กม.17+000.000 | | |

ข้อกำหนดทั่วไป

1. รายละเอียดชุดพิมพ์โครงสร้างทางนี้ สามารถแก้ไขในคานเรขาคณิตและโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพของทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบของผู้ชำนาญการสำนักงานทางหลวงที่ 5
2. แนวทางที่แสดงไว้ในแบบ PLAN & PROFILE ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาแก้ไขได้ ทั้งนี้เพื่อให้มีความเหมาะสมในสนาม
3. ให้ผู้รับจ้างทำการติดตั้งไม้ควบคุมจราจร และจัดทำเครื่องหมายควบคุมการจราจร ในระหว่างการก่อสร้างตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงของกรมทางหลวง คู่มือเล่มที่ 3 ฉบับปี พ.ศ.2561
4. รถขนส่งวัสดุต้องปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎหมายทางหลวง
5. ระดับก่อสร้าง (PROFILE GRADE) บริเวณจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ รวมถึงปริมาณคอสะพานหรือท่อเหลี่ยม หากไม่ได้ในระบวให้ดำเนินการตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG. NO. GD - 607
6. กรณีต้องปูผิว A.C. บนพื้นสะพานให้พิจารณาดำเนินการดังนี้
 - 7.1) กรณีพื้นสะพานเดิมปูกับคิ้วผิว A.C. อยู่แล้ว ให้ทุบหรือผิว A.C. เดิมออก แล้วทำการลาดแอสฟัลต์ TACK COAT ตามมาตรฐานที่ ทล-ม403/2531 ก่อนปูผิวจราจรด้วย A.C. WEARING COURSE หนา 0.05 ม
 - 7.2) กรณีพื้นสะพานเดิมไม่มีกรปูกับคิ้วผิว A.C. ให้ทำการลาดแอสฟัลต์ TACK COAT แล้วดำเนินการดังข้อ 7.1
7. กรณีไม่จำเป็นต้องปูผิว A.C. บนพื้นสะพานให้พิจารณาดำเนินการดังนี้
 - 8.1) ให้เว้นการดำเนินการ PAVEMENT RECYCLING ในระยะไม่น้อยกว่า 2.00 ม จากคอสะพาน หรือจาก BRIDGE APPROACH SLAB แล้วทำการลาดแอสฟัลต์ TACK COAT ก่อนปูผิวด้วย A.C. WEARING COURSE เพื่อปรับระดับผิวเข้าหาสะพาน ทั้งนี้ หากมีจุดอ่อนตัว (SOFT SPOT) ในบริเวณดังกล่าว ต้องทำการแก้ไขให้เรียบร้อก่อนเริ่มทำการใด ๆ
 - 8.2) หากไม่มีรายการ PAVEMENT RECYCLING ให้ทำการปรับระดับผิวจราจรเข้าหาคอสะพาน ในระยะไม่น้อยกว่า 2.00 ม
8. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเพิ่มระยะ TRANSITION ที่จุดเริ่มต้นการก่อสร้าง, จุดสิ้นสุดการก่อสร้าง, บริเวณทางแยก, ทางเชื่อม, การก่อสร้างเพื่อสาธารณะประโยชน์ เช่น BUS STOP เป็นต้น สามารถก่อสร้างโดยได้รับความเห็นชอบ ความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน
9. ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อสร้างทาง เข้า - ออก ซึ่งเป็นทางสาธารณะได้ และในกรณีที่เป็นทาง เข้า - ออก คู่มือซึ่งได้รับการอนุมัติให้เชื่อมต่อกับทางหลวง ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณา ให้เชื่อมต่อกับทางหลวงได้
10. ทั่วไปในการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง อ้างอิงตามคู่มือเครื่องหมายจราจรภาค 2 "เครื่องหมายจราจร (MARKING)" ฉบับปี พ.ศ. 2533

11. ข้อกำหนดงานสีเทอร์โมพลาสติก
 - ก่อนดำเนินการสีเส้นจราจร ผู้รับจ้างจะต้องทำการกองสติกส์ที่จะใช้สีเส้นจราจร ณ หมดทางหลวง ใกล้เคียงโครงการ และผู้ควบคุมงานหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพวัสดุจะสุ่มเก็บตัวอย่างสี ส่งทดสอบที่ ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)
 - เมื่อผลการทดสอบผ่านแล้ว ผู้ควบคุมงานจะลงชื่อกำกับถุงสีทั้งหมด และอนุญาตให้ผู้รับจ้างนำสีจาก กองสติกส์ไปใช้สีเส้นจราจรได้ แล้วจะต้องนำถุงสีที่ไว้แล้ว กลับมาเก็บที่กองสติกส์เดิม
 - หากผลการทดสอบไม่ผ่านข้อกำหนด หรือสีมีปริมาณถูกแก้วกว่าที่กำหนด จะไม่อนุญาตให้นำสีจาก กองสติกส์ทั้งหมดมาใช้สีเส้นจราจร และผู้รับจ้างจะต้องนำสีมากองสติกส์ใหม่ และทำการเก็บตัวอย่าง
 - การทดสอบสีเทอร์โมพลาสติกจะทำการทดสอบหาปริมาณถูกแก้วที่ผสมในเนื้อสี ตามมาตรฐาน มอก 452 - 2549 วัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง สำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง และตาม ข้อกำหนดวัสดุงานทาง ทล - ก.604/2525 วัสดุเทอร์โมพลาสติกสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง - สีเทอร์โมพลาสติก จะต้องมีความเป็นสีเหลือง ตามเกณฑ์มาตรฐาน 13538 ตาม FED-STD 595 B
12. งาน THERMOPLASTIC PAINT หากเป็นการตีเส้นจราจรบนพื้นทางเดิม ผู้รับจ้างต้องทำการกระเทาะเส้นและ เครื่องหมายจราจรเดิมออกให้เรียบร้อย ก่อนดำเนินการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางตามข้อกำหนด และมาตรฐานของกรมทางหลวงต่อไป
13. บริเวณโค้งที่มีเหล็กนำโค้งและ GUARD RAIL ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจะเป็นผู้กำหนดให้ถอนออกและผู้ รับจ้างจะต้องทำปญชหรือหนังสือส่งมอบวัสดุสิ่งของที่รื้อถอนทิ้งลงในสภาพที่เรียบร้อย
14. FOR SPECIFICATION OF CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH, TEST RESULTS OF STANDARD CONCRETE 15x15x15 CENTIMETER CUBE AGED AT 28 DAYS ARE USED AS CRITERION, IN CASE THE COMPRESSIVE STRENGTHS OBTAINED FROM THE TESTING AT AGED EARLIER THAN 28 DAYS ARE NOT LESS THAN THE COMPRESSIVE STRENGTH AS SPECIFIED, THE CONCRETE SHALL BE AS HAVING SPECIFIED COMPRESSIVE STRENGTH AT AGED OF 28 DAYS
15. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือคุรุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้น้ำหนักกว่า ร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดของสัญญา และผู้รับจ้าง ต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา "

๒๒๖/๒๕๖๕
 ๒๒๖/๒๕๖๕

REMARKS
 ข้อกำหนดแก้ไข
 VOID

| กรมทางหลวง | | |
|-----------------|------|----------------|
| เขียน ทัศนรัตน์ | ทวน | ks |
| ออกแบบ Mr. Pany | ตรวจ | Pany รท.ว.ทล.5 |
| เห็นชอบ | | 29/ก.ค.65 |
| อนุญาต | | 29/ก.ค.65 |

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

แนวทางหลวง: 0100
 ตรีศลิคที่ 2: 0100
 แผนที่: B3

INDEX OF DRAWINGS

ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100
 ตอน หัวขมิ้นฮัก - เคนซาคี
 กม12+263.000 - กม17+000.000

PART 1 LIST OF DRAWINGS FOR ROADWORK 2015 REVISION

| SHEET NO. | TITLE | DRAWING NO. |
|---|---|---|
| 47 | KILOMETER MARKER | KILOMETER STONE CD - 707 |
| 48 | | KILOMETER SIGN CD - 708 |
| 49 | CONCRETE CURB & CURB AND CUTTER | CD - 709 |
| 50 | SIDEWALK | CD - 710 |
| SECTION 3) TRAFFIC SIGN, MARKING AND SAFETY DEVICES | | |
| 51 | MINOR ROAD SIGN | SIGN & POST DETAILS RS - 101 |
| 52 | | ROAD SIGN AT EXIT AND ENTRANCE RS - 102 |
| 53 | | ROAD SIGN AT INTERSECTION RS - 103 |
| 54 | | ROAD SIGN AT CLIMBING LAKE RS - 104 |
| 55 | TRAFFIC MARKING | MARKING DETAIL - I RS - 201 |
| 56 | | MARKING DETAIL - II RS - 202 |
| 57 | | ROAD STUD RS - 203 |
| 58 | TRAFFIC CONTROL DEVICE FOR HIGHWAY UNDER CONSTRUCTION | TRAFFIC SIGN AND DEVICES - I RS - 301 |
| 59 | | TRAFFIC SIGN AND DEVICES - II RS - 302 |
| 60 | | INSTALLATION GUIDELINE - I RS - 303 |
| 61 | | INSTALLATION GUIDELINE - II RS - 304 |
| 62 | | INSTALLATION GUIDELINE - III RS - 305 |
| 63 | OVERHEAD AND OVERHANGING SIGN INSTALLATION | RS - 401 |
| 64 | INSTALLATION OF OVERHEAD SIGN AND TRAFFIC SIGN ON BRIDGE BARRIERS | RS - 402 |
| 65 | OVERHANG TRAFFIC SIGN | SIGN BOARD DETAILS RS - 403 |
| 66 | | STEEL FRAME FOR MOUNTING WIDTH < 18.00 M. RS - 404 |
| 67 | | STEEL FRAME FOR MOUNTING WIDTH < 20.00 M. RS - 405 |
| 68 | | STEEL FRAME FOR MOUNTING < 20.00 M. < WIDTH < 28.00 M. RS - 406 |
| 69 | | ILLUMINATED SIGN RS - 407 |
| 70 | OVERHANG TRAFFIC SIGN | STEEL POLE TYPE I FOR SIGN PLATES NOT MORE THAN 82,800 SQ.CM. RS - 501 |
| 71 | | STEEL POLE TYPE I FOR SIGN PLATES NOT MORE THAN 108,000 SQ.CM. RS - 502 |
| 72 | | STEEL POLE TYPE I FOR SIGN PLATES NOT MORE THAN 245,800 SQ.CM. RS - 503 |
| 73 | | FOOTING DETAILS RS - 504 |
| 74 | BARRICADE | TWO LANES AT T-INTERSECTION RS - 601 |
| 75 | | MULTILANES AT T-INTERSECTION RS - 602 |
| 76/R1 | GUARDRAIL | SINGLE W - BEAM GUARDRAIL RS - 603 |
| 77/R1 | | DOUBLE W - BEAM GUARDRAIL RS - 604 |
| 78 | | INSTALLATION AND W - BEAM GUARDRAIL APPROACH TYPE - I RS - 606 |
| 79 | | INSTALLATION AND W - BEAM GUARDRAIL APPROACH TYPE - II RS - 608 |
| 80 | GUIDE POST | RS - 607 |
| 81 | CONCRETE BARRIER | TYPE I RS - 606 |
| 82 | | TYPE II RS - 609 |
| 83 | | TYPE III : FOR DEEP CUT AND HIGH FILL RS - 610 |
| 84 | | PRE-CAST CONCRETE BARRIER TYPE IA RS - 611 |
| 85 | | PRE-CAST CONCRETE BARRIER TYPE IB RS - 612 |
| 86 | | PRE-CAST CONCRETE BARRIER TYPE IIA RS - 613 |
| 87 | | PRE-CAST CONCRETE BARRIER TYPE IIB RS - 614 |
| 88 | | CONCRETE BARRIER AT BRIDGE APPROACH RS - 615 |
| SECTION 4) DRAINAGE SYSTEMS | | |
| 89 | R.C. CULVERT | DIMENSION AND REINFORCEMENT DETAILS DS - 101 |
| 90 | | INSTALLATION DETAILS DS - 102 |
| 91 | CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT | END WALL TYPE DS - 103 |
| 92 | | WING WALL TYPE FOR SINGLE CULVERT DS - 104 |
| 93 | | WING WALL TYPE FOR MULTIPLE CULVERTS DS - 105 |
| 94 | | WING WALL TYPE FOR SKEW CULVERTS DS - 106 |
| 95 | SIDE DITCH LINING | DS - 201 |
| 96 | INLET FOR R.C. PIPE CULVERT | DROP INLET FOR SIDE DITCH DS - 301 |
| 97 | | INLET CATCH BASIN DS - 302 |
| 98 | DROP INLET IN MEDIAN | TYPE A : FOR BASED MEDIAN DS - 401 |
| 99 | | TYPE B : FOR BARRIER MEDIAN DS - 402 |
| 100 | | TYPE C : FOR DEPRESS MEDIAN - I DS - 403 |
| 101 | | TYPE D : FOR DEPRESS MEDIAN - II DS - 404 |
| 102 | | TYPE E : FOR DEPRESS MEDIAN - III (R.C. BOX CULVERT) DS - 405 |
| 103 | | TYPE F : FOR BRIDGE DRAINAGE DS - 406 |

๒๖/๑๒/๒๕๖๕
 ๒๖/๑๒/๒๕๖๕

TRAFFIC
 ๒๖/๑๒/๒๕๖๕

PART 1 LIST OF DRAWINGS FOR ROADWORK 2015 REVISION

| SHEET NO. | TITLE | DRAWING NO. |
|---|---|---|
| 104 | R.C. DRAIN OUTLET FOR R.C. PIPE CULVERT | DS - 501 |
| 105 | CURB AND DRAIN CHUTE FOR DRAINAGE PROTECTION | DS - 502 |
| 106 | R.C. U-DITCH | TYPE A & B DS - 501 |
| 107 | | TYPE C DS - 502 |
| 108 | | TYPE D & E DS - 503 |
| 109 | | TYPE F : FOR BRIDGE DRAINAGE DS - 504 |
| 110 | MANHOLE | TYPE A DS - 701 |
| 111 | | TYPE B DS - 702 |
| 112 | | TYPE C DS - 703 |
| 113 | | TYPE D DS - 704 |
| 114 | | TYPE E : FOR BOX CULVERT (OPEN - TYPE) DS - 705 |
| 115 | | TYPE F : FOR BOX CULVERT (OPEN - TYPE) DS - 706 |
| 116 | | TYPE G DS - 707 |
| 117 | | TYPE H DS - 708 |
| 118 | | TYPE I DS - 709 |
| 119 | | TYPE J DS - 710 |
| SECTION 5) STABILITY AND EROSION PROTECTION | | |
| 120 | SLOPE PROTECTION FOR FILL SLOPE | SOODING SP - 101 |
| 121 | | RIP RIP SP - 102 |
| 122 | | BACKED CONCRETE SP - 103 |
| 123 | | ROCK AND WIRE MATTRESS SP - 104 |
| 124 | SLOPE PROTECTION FOR CUT SLOPE | SHOTCRETE SP - 201 |
| 125 | | FERRO - CEMENT SP - 202 |
| 126 | | NETHER GRASSING SP - 203 |
| 127 | | HYDROSEEDING SP - 204 |
| 128 | SLOPE PROTECTION FOR BRIDGE ABUTMENT | CONCRETE LINING SP - 301 |
| 129 | | MATERIAL AND GABION SP - 302 |
| 130 | REINFORCE SOIL SLOPE | TYPE CROSS SECTION SP - 401 |
| 131 | | MATERIAL SPECIFICATION SP - 402 |
| 132 | MECHANICALLY STABILIZED EARTH WALL (MSE WALL) | GUIDELINES AND DESIGN CRITERIA OF MSE WALL SP - 501 |
| 133 | | GENERAL ARRANGEMENT MSE WALL FOR BRIDGE APPROACH SP - 502 |
| 134 | | MSE WALL FOR BRIDGE APPROACH TYPE I SP - 503 |
| 135 | | MSE WALL FOR BRIDGE APPROACH TYPE II SP - 504 |
| 136 | | MSE WALL FOR BRIDGE APPROACH TYPE III SP - 505 |
| 137 | | GENERAL ARRANGEMENT MSE WALL FOR ROAD SIDE SLOPE SP - 506 |
| 138 | | TYPICAL SECTION OF MSE WALL FOR HILL SIDE SLOPE SP - 507 |
| 139 | | TYPICAL SECTION OF MSE WALL FOR SOIL SLOPE SP - 508 |
| 140 | | DETAILS OF FACING PANEL AND REINFORCING DETAILS SP - 509 |

REMARKS
 STANDARD DRAWINGS USED
 VOID

กรมทางหลวง

| | | |
|-----------------|--------------|------------|
| เขียน ทัศนศิลป์ | ทวน | ๒๙/๑๒/๒๕๖๕ |
| ออกแบบ Mr. May | ตรวจ Mr. May | ๒๙/๑๒/๒๕๖๕ |
| เห็นชอบ | ๒๙/๑๒/๒๕๖๕ | ๒๙/๑๒/๒๕๖๕ |
| อนุญาต | ๒๙/๑๒/๒๕๖๕ | ๒๙/๑๒/๒๕๖๕ |

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)


| | | |
|-------------|------------|--------|
| แขวงทางหลวง | รหัสควบคุม | แผนที่ |
| จุดคิดที่ 2 | 0100 | C1 |

TYPICAL CROSS - SECTION

ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100

ดอน หัวน้อฮกา - เด่นชาติ

กม.12+283.000 - กม.17+000.000

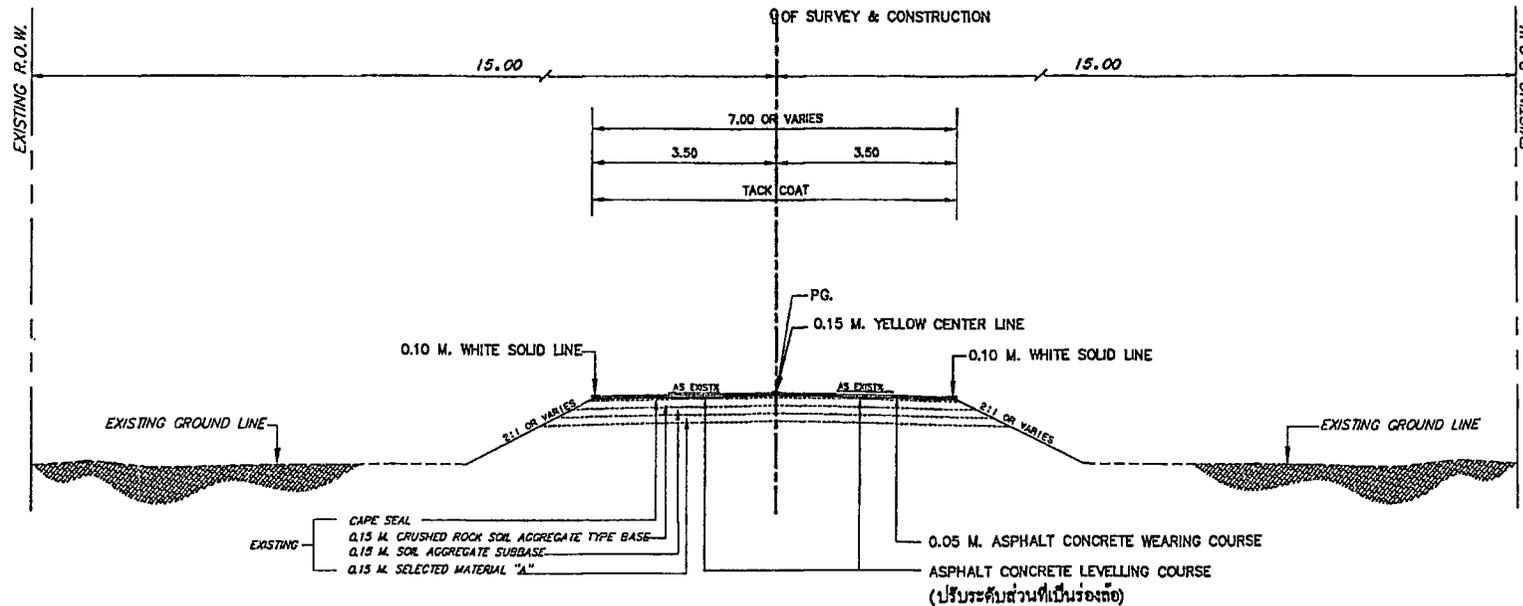

TYPICAL CROSS - SECTION
STA.12+283.000 - STA.16+000.000

SCALE 1:100

1/2
 1/3
TRACER

หมายเหตุ :-

1. ฉติเป็นมตร เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
2. งานสีตีเส้น ให้ตีเส้น ตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจร ภาค 2 " เครื่องหมายจราจร " (MARKING) ฉบับปี พ.ศ. 2533
3. ปริมาณงานได้รวมพื้นที่ WIDENING ไว้แล้ว
4. บริเวณขอบเขตการก่อสร้างที่จุดเริ่มต้นโครงการฯ และจุดสิ้นสุดโครงการฯ ให้ปรับระดับเข้าหาผิวทางเดิมด้วย

ASPHALT CONCRETE LEVELLING ชาวไม่น้อยกว่าด้านละ 10.00 ม

| กรมทางหลวง | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| เปิดน พยัศร์คณ์ | ทวน | <i>[Signature]</i> |
| ออกนบว น พยัศร์คณ์ | ตรวจ | <i>[Signature]</i> รกวนทล.5 |
| เห็นชอบ | <i>[Signature]</i> | 29/ธ.ค/65 |
| อนุญาต | <i>[Signature]</i> | 29/ธ.ค/65 |

สถานีงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)


| | | |
|------------------|------------|--------|
| แขวงทางหลวง | รหัสควบคุม | แผนที่ |
| จุดเริ่มต้นที่ 2 | 0100 | C2 |

TYPICAL CROSS - SECTION

ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100

คอน ห้วยน้อยกา - เต็มชาติ

กม.12+283.000 - กม.17+000.000

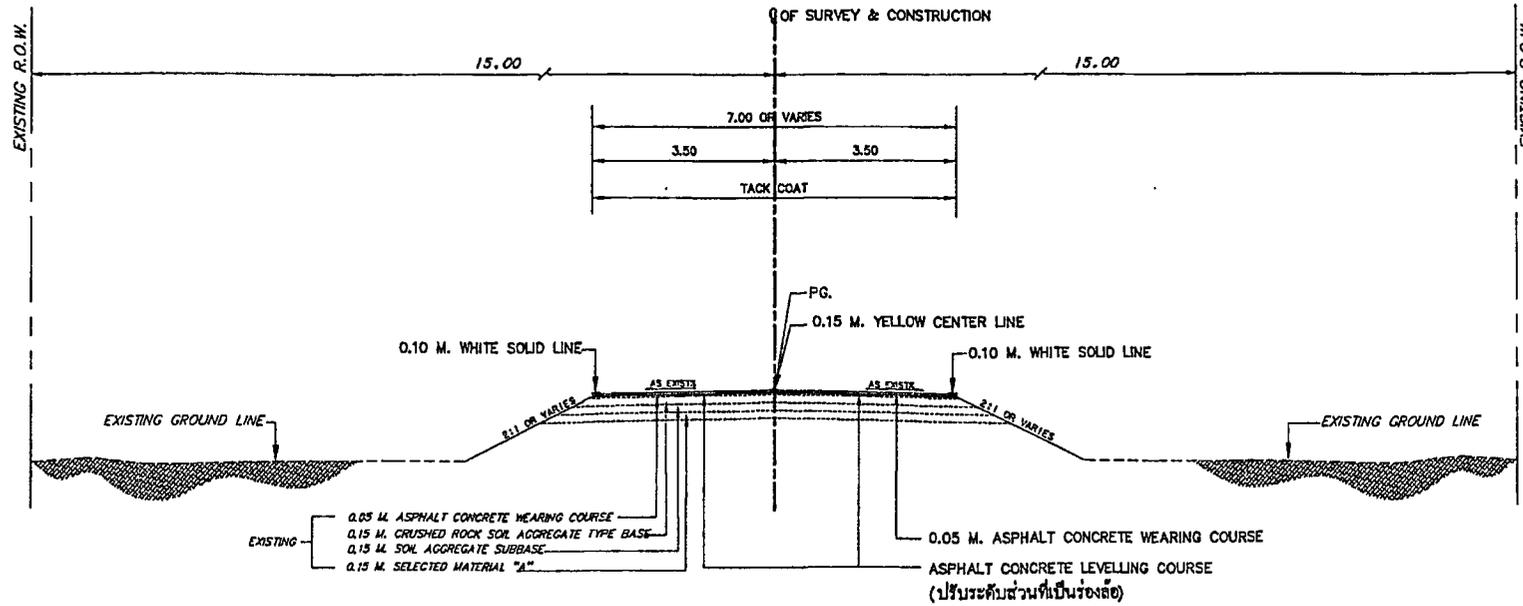

TYPICAL CROSS - SECTION
STA.16+000.000 - STA.17+000.000

SCALE 1:100

วิศวกร
 ควบคุม
 งาน
 ควบคุม
 งาน
 ควบคุม
 งาน

หมายเหตุ :-

1. ผลิตเป็นเมตร เริ่มตั้งแต่ระยะเป็นอย่างไร
2. งานสีตีเส้น ให้ตีเส้น ตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจร ภาค 2 " เครื่องหมายจราจร " (MARKING) ฉบับปี พ.ศ. 2533
3. ปริมาณงานได้รวมพื้นที่ WIDENING ไว้แล้ว
4. บริเวณขอบเขตการก่อสร้างที่จุดเริ่มต้นโครงการฯ และจุดสิ้นสุดโครงการฯ ให้ปรับระดับเข้าหาผิวทางเดิมด้วย ASPHALT CONCRETE LEVELLING ขาวไม่น้อยกว่าด้านละ 10.00 ม.

กรมทางหลวง

| | | |
|-----------------|---------------------------------------|------------|
| เขียน ทัศนวิสัย | งาน | Bar |
| ออกแบบ Mr. Mpy | ตรวจ Mr. Mpy | รท.ว.ทล.5 |
| เห็นชอบ | รศ.ทล.5.1 รักษาการในตำแหน่ง รศ.ทล.5.2 | 29/ค.ค./65 |
| อนุญาต | Y. Dornum รศ.ทล.5 | 29/ค.ค./65 |

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

แขวงทางหลวง รหัสควบคุม แผนที่
 ภูทิวทัศน์ 2 0100 D1

SUMMARY OF QUANTITIES

ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100
 ตอน ทวีชัยออก - เดนชาติ
 กม.112+263.000 - กม.117+000.000

| ITEM | DESCRIPTION | UNIT | QUANTITIES | REMARK |
|-----------|---|-------|------------|----------|
| 1 | REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES | | | |
| 1.1 | REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE | SQ.M. | -- | |
| 1.2 | REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SLAB | SQ.M. | -- | |
| 1.3 | REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BRIDGE | | | |
| 1.3(1) | AT STA. | L.S. | -- | |
| 1.3(2) | AT STA. | L.S. | -- | |
| 1.4 | REMOVAL OF EXISTING BOX CULVERTS | | | |
| 1.4(1) | AT STA. | L.S. | -- | |
| 1.5 | REMOVAL OF EXISTING CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE | CU.M. | -- | |
| 1.6 | REMOVAL OF EXISTING BARRIER CURB | M. | -- | |
| 1.7 | REMOVAL OF EXISTING TIMBER BRIDGES | | | |
| 1.8(1) | AT STA. | L.S. | -- | |
| 1.8(2) | AT STA. | L.S. | -- | |
| 1.7 | MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 8 CM. DEPTH | SQ.M. | -- | |
| 1.8 | MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE TO CM. DEPTH | SQ.M. | -- | |
| 2 | EARTHWORK | | | |
| 2.1 | CLEARING AND GRUBBING | SQ.M. | -- | |
| 2.2 | ROADWAY EXCAVATION | | | |
| 2.2(1) | EARTH EXCAVATION | CU.M. | -- | |
| 2.2(2) | SOFT ROCK EXCAVATION | CU.M. | -- | |
| 2.2(3) | HARD ROCK EXCAVATION | CU.M. | -- | |
| 2.2(4) | UNSATURABLE MATERIAL EXCAVATION | CU.M. | -- | |
| 2.2(5) | SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) | CU.M. | -- | |
| 2.3 | EMBANKMENT | | | |
| 2.3(1) | EARTH EMBANKMENT | CU.M. | -- | |
| 2.3(2) | SAND EMBANKMENT | CU.M. | -- | |
| 2.3(3) | ROCK EMBANKMENT | CU.M. | -- | |
| 2.3(4) | EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND | CU.M. | -- | |
| 2.3(4.2) | SAND FILL IN MEDIAN & ISLAND | CU.M. | -- | |
| 2.3(5.1) | EARTH FILL UNDER SIDEWALK | CU.M. | -- | |
| 2.3(5.2) | SAND FILL UNDER SIDEWALK | CU.M. | -- | |
| 2.3(6) | FIBROUS BACKFILL | CU.M. | -- | |
| 2.3(7) | BEAM | CU.M. | -- | |
| 2.3(8) | EARTH DIKE | CU.M. | -- | |
| 2.3(9) | SOIL STABILIZED EMBANKMENT | CU.M. | -- | |
| 2.3(10) | FOUNDATION IMPROVEMENT | | | |
| 2.3(10.1) | PREFABRICATED VERTICAL DRAIN | M. | -- | |
| 2.3(10.2) | LINE/CEMENT COLUMN DIA. | M. | -- | |
| 2.4 | SELECTED MATERIALS | | | |
| 2.4(1) | SELECTED MATERIAL B | CU.M. | -- | |
| 2.4(2) | SELECTED MATERIAL A | CU.M. | -- | |
| 3 | SUBBASE AND BASE COURSES | | | |
| 3.1 | SUBBASE | | | |
| 3.1(1) | SOIL AGGREGATE SUBBASE | CU.M. | -- | |
| 3.1(2) | SOIL CEMENT SUBBASE | CU.M. | -- | |
| 3.2 | BASE COURSES | | | |
| 3.2(1) | CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE | CU.M. | -- | |
| 3.2(2) | CRUSHED GRAVEL SOIL AGGREGATE TYPE BASE | CU.M. | -- | |
| 3.2(3) | CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE | CU.M. | -- | |
| 3.2(4) | SOIL CEMENT BASE | CU.M. | -- | |
| 3.2(5) | PAVEMENT IN PLACE RECYCLING 0.20 M. DEPTH | SQ.M. | -- | |
| 3.2(6) | SOFT SPOT EXCAVATION AND REPLACEMENT | | | |
| 3.2(6.1) | SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) | CU.M. | -- | |
| 3.2(6.2) | SELECTED MATERIAL A | CU.M. | -- | |
| 3.2(6.3) | SOIL AGGREGATE SUBBASE | CU.M. | -- | |
| 3.2(6.4) | CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE | CU.M. | -- | |
| 3.2(7) | CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE | CU.M. | -- | (LOSS) |
| 3.3 | SHOULDER | | | |
| 3.3(1) | SOIL AGGREGATE SHOULDER | CU.M. | -- | |
| 3.4 | MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT | | | |
| 3.4(1) | SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT | CU.M. | -- | |
| 3.4(2) | CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE | CU.M. | -- | |
| 3.5 | SCAFFOLDING & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 0.10 M. THICK | SQ.M. | -- | |
| 3.6 | SOIL AGGREGATE TEMPORARY SURFACE (CONNECTION ROAD ONLY) | CU.M. | -- | |
| 4 | SURFACE COURSES | | | |
| 4.1 | PRIME COAT & TACK COAT | | | |
| 4.1(1) | PRIME COAT (EAP.MC-70) | SQ.M. | -- | |
| 4.1(2) | TACK COAT (R31) 1% 1% 1% 1% | SQ.M. | -- | |
| 4.1(3) | TACK COAT (R31) 2% 2% 2% 2% | SQ.M. | 35,099 | |
| 4.2 | SURFACE TREATMENTS | | | |
| 4.2(1) | SINGLE SURFACE TREATMENT | SQ.M. | -- | |
| 4.2(2) | DOUBLE SURFACE TREATMENT | SQ.M. | -- | |
| 4.3 | PENETRATION MACADAM | SQ.M. | -- | |
| 4.4 | ASPHALT CONCRETE | | | |
| 4.4(1) | ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE | TON | 34 | |
| 4.4(2) | ASPHALT BOUND BASE | SQ.M. | -- | |
| 4.4(3) | ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM THICK (ON PRIME COAT) | SQ.M. | -- | ปริมาณ 4 |
| 4.4(4) | ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM THICK (ON TACK COAT) | SQ.M. | 34,828 | ปริมาณ 4 |
| 4.4(5) | ASPHALT CONCRETE SHOULDER | SQ.M. | -- | |
| 4.4(6) | MODIFIED ASPHALT CONCRETE M. THICK | SQ.M. | -- | |
| 4.5 | ASPHALT CONCRETE SURFACE EDGE M. WIDTH | M. | -- | |
| 4.6 | COLD MIXED ASPHALT | CU.M. | -- | |
| 4.7 | SLURRY SEAL | | | |
| 4.7(1) | SLURRY SEAL TYPE I | SQ.M. | -- | |
| 4.7(2) | SLURRY SEAL TYPE II | SQ.M. | -- | |
| 4.7(3) | SLURRY SEAL TYPE III | SQ.M. | -- | |
| 4.7(4) | SLURRY SEAL TYPE IV | SQ.M. | -- | |
| 4.7(5) | PARA SLURRY SEAL TYPE I | SQ.M. | -- | |
| 4.7(6) | PARA SLURRY SEAL TYPE II | SQ.M. | -- | |
| 4.7(7) | PARA SLURRY SEAL TYPE III | SQ.M. | -- | |
| 4.8 | CAPE SEAL | | | |
| 4.8(1) | CAPE SEAL TYPE I (SLURRY SEAL TYPE II) | SQ.M. | -- | |
| 4.8(2) | CAPE SEAL TYPE II (SLURRY SEAL TYPE II) | SQ.M. | -- | |

| ITEM | DESCRIPTION | UNIT | QUANTITIES | REMARK |
|-----------|--|------------|------------|----------|
| 4.9 | PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT | | | |
| 4.9(1) | PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM THICK | SQ.M. | -- | |
| 4.9(2) | EXPANSION JOINT | M. | -- | |
| 4.9(3) | CONTRACTION JOINT | M. | -- | |
| 4.9(4) | LONGITUDINAL JOINT | M. | -- | |
| 4.9(5) | DUMMY JOINT | M. | -- | |
| 4.9(6) | EDGE JOINT | M. | -- | |
| 4.10 | CONCRETE PAVEMENT REPAIRING | | | |
| 4.10(1) | JOINT DUE TO PUMPING JOINT REPAIRING | M. | -- | |
| 4.10(2) | TRANSVERSE & LONGITUDINAL JOINT REPAIRING | M. | -- | |
| 4.10(3) | SHALLOW JOINT SPALLING REPAIRING | M. | -- | |
| 4.10(4) | SHATTERED SLAB REPAIRING | SQ.M. | -- | |
| 4.10(5) | JOINT SEALER | M. | -- | |
| 4.10(6) | BRG SEALING | SQ.M. | -- | |
| 5 | STRUCTURES | | | |
| 5.1 | CONCRETE BRIDGES | | | |
| 5.1(1) | NEW CONCRETE BRIDGES | | | |
| 5.1(1.1) | AT STA. | | | |
| | (TYPE, SIZE M., ROADWAY WIDTH M.) SKEW | M. | -- | |
| 5.1(1.2) | AT STA. | | | |
| | (TYPE, SIZE M., ROADWAY WIDTH M.) | M. | -- | |
| 5.1(2) | WIDENING OF EXISTING BRIDGE ROADWAY | | | |
| 5.1(2.1) | AT STA. | | | |
| | FROM M. TO M. | M. | -- | |
| 5.1(2.2) | AT STA. | | | |
| | FROM M. TO M. | M. | -- | |
| 5.1(3) | BRIDGE APPROACH STRUCTURES | | | |
| 5.1(3.1) | AT STA. | (WIDTH M.) | M. | -- |
| 5.1(3.2) | AT STA. | (WIDTH M.) | M. | -- |
| 5.1(4) | BRIDGE APPROACH SLAB | SQ.M. | -- | |
| 5.1(5) | BEARING UNIT | SQ.M. | -- | |
| 5.1(6) | ABUTMENT PROTECTOR | SQ.M. | -- | |
| 5.1(7) | PEDESTRIAN BRIDGES | | | |
| 5.1(7.1) | AT STA. (APPROX.) | EACH | -- | DWG. NO. |
| 5.1(7.2) | AT STA. (APPROX.) | EACH | -- | DWG. NO. |
| 5.1(8) | P.C. PILE | | | |
| 5.1(8.1) | P.C. PILE, 0.22 M. x 0.22 M. | LM. | -- | |
| 5.1(8.2) | P.C. PILE, 0.28 M. x 0.28 M. | LM. | -- | |
| 5.1(8.3) | P.C. PILE, 0.35 M. x 0.35 M. | LM. | -- | |
| 5.1(8.4) | P.C. PILE, 0.40 M. x 0.40 M. | LM. | -- | |
| 5.1(8.5) | P.C. PILE, 0.22 M. x 0.22 M. (PILE TYPE I OR II) | LM. | -- | |
| 5.1(8.6) | P.C. PILE, 0.28 M. x 0.28 M. | LM. | -- | |
| 5.1(8.7) | SPUR PILE | LM. | -- | |
| 5.1(8.8) | DIAM. 0.80 M. | LM. | -- | |
| 5.1(8.9) | DIA. 0.80 M. | LM. | -- | |
| 5.1(10) | BORED PILE | | | |
| 5.1(10.1) | DIA. 0.80 M. | LM. | -- | |
| 5.1(10.2) | DIA. 0.80 M. | LM. | -- | |
| 5.1(10.3) | DIA. 0.80 M. | LM. | -- | |
| 5.1(10.4) | DIA. 1.00 M. | LM. | -- | |
| 5.1(10.5) | DIA. 1.20 M. | LM. | -- | |
| 5.1(10.6) | DIA. 1.20 M. | LM. | -- | |
| 5.1(11) | R.C. PILE | | | |
| 5.1(11.1) | R.C. PILE, 0.22 M. x 0.22 M. | LM. | -- | |
| 5.1(11.2) | R.C. PILE, 0.28 M. x 0.28 M. | LM. | -- | |
| 5.1(11.3) | R.C. PILE, 0.35 M. x 0.35 M. | LM. | -- | |
| 5.1(11.4) | R.C. PILE, 0.40 M. x 0.40 M. | LM. | -- | |
| 5.1(12) | STATIC LOAD TEST ON | | | |
| 5.1(12.1) | | EA. | -- | |
| 5.1(12.2) | | EA. | -- | |
| 5.1(13) | DYNAMIC LOAD TEST ON | | | |
| 5.1(13.1) | | EA. | -- | |
| 5.1(13.2) | | EA. | -- | |
| 5.2 | R.C. BOX CULVERTS | | | |
| 5.2(1) | NEW R.C. BOX CULVERTS | | | |
| 5.2(1.1) | AT STA. SIZE M. | M. | -- | |
| 5.2(1.2) | AT STA. SIZE M. | M. | -- | |
| 5.2(2) | EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS | | | |
| 5.2(2.1) | AT STA. SIZE M. | M. | -- | |
| 5.2(2.2) | AT STA. SIZE M. | M. | -- | |
| 5.2(3) | R.C. BOX CULVERTS SIDE DRAINS | | | |
| 5.2(3.1) | SIZE | M. | -- | |
| 5.2(3.2) | SIZE | M. | -- | |
| 5.3 | R.C. PIPE CULVERTS | | | |
| 5.3(1) | DIA. 0.30 M. CLASS II | M. | -- | |
| 5.3(2) | DIA. 0.40 M. CLASS II | M. | -- | |
| 5.3(3) | DIA. 0.60 M. CLASS II | M. | -- | |
| 5.3(4) | DIA. 0.80 M. CLASS II | M. | -- | |
| 5.3(5) | DIA. 1.00 M. CLASS II | M. | -- | |
| 5.3(6) | DIA. 1.20 M. CLASS II | M. | -- | |
| 5.3(7) | DIA. 1.50 M. CLASS II | M. | -- | |
| 5.4 | POSITION REMOVAL OF R.C. PIPE CULVERTS | | | |
| 5.4(1) | DIA. 0.80 M. | M. | -- | |
| 5.4(2) | DIA. 0.80 M. | M. | -- | |
| 5.4(3) | DIA. 1.00 M. | M. | -- | |
| 5.4(4) | DIA. 1.20 M. | M. | -- | |
| 6 | MISCELLANEOUS | | | |
| 6.1 | SLOPE PROTECTION | | | |
| 6.1(1) | CONCRETE SLOPE PROTECTION | SQ.M. | -- | |
| 6.1(2) | SHOTCRETE SLOPE PROTECTION | SQ.M. | -- | |

| ITEM | DESCRIPTION | UNIT | QUANTITIES | REMARK |
|------------|---|-------|------------|--|
| 6.1(3) | BACKED CONCRETE SLOPE PROTECTION | SQ.M. | -- | |
| 6.1(4) | R/RAP SLOPE PROTECTION | | | |
| 6.1(4.1) | PLAN R/RAP | SQ.M. | -- | |
| 6.1(4.2) | MORTAR R/RAP | SQ.M. | -- | |
| 6.1(5) | GEOTEXTILE SLOPE PROTECTION | SQ.M. | -- | |
| 6.1(6) | CARBONS | | | |
| 6.1(6.1) | GALVANIZED 8 x 12 CM. WESH. SIZE 1.50 x 1 x 1 M. | NO. | -- | ราคา [ราคา/ตารางเมตร/ตารางเมตร] = 342/27/2.2 มม. |
| 6.1(6.2) | GALVANIZED 8 x 12 CM. WESH. SIZE 3 x 1 x 1 M. | NO. | -- | ราคา [ราคา/ตารางเมตร/ตารางเมตร] = 342/27/2.2 มม. |
| 6.1(7) | R/RAP MATRESS SLOPE PROTECTION CM. THICK | | | |
| 6.1(7.1) | GALVANIZED 8 x 8 CM. WESH. SIZE 3 x 1 x 0.30 M. | NO. | -- | ราคา [ราคา/ตารางเมตร/ตารางเมตร] = 27/22/2.0 มม. |
| 6.1(8) | FERRI-CEMENT BACK SLOPE PROTECTION | SQ.M. | -- | |
| 6.1(9) | CONCRETE SQUARE GRID SLOPE PROTECTION | SQ.M. | -- | |
| 6.1(10) | CONCRETE GRID BEAM BACK SLOPE PROTECTION | SQ.M. | -- | |
| 6.1(11) | GRASSING IN SQUARE GRID AND GRID BEAM | SQ.M. | -- | |
| 6.1(12) | NETTING GRASSING FOR SLOPE PROTECTION | SQ.M. | -- | |
| 6.1(13) | HYDROSEEDING FOR SLOPE PROTECTION | SQ.M. | -- | |
| 6.1(14) | ASPHALT CURB FOR EMBANKMENT PROTECTION | M. | -- | DWG. NO. DS - 302 |
| 6.1(15) | R.C. DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION | M. | -- | DWG. NO. DS - 302 |
| 6.1(16) | PLAIN CONCRETE AT TOE OF R.C. DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION | SQ.M. | -- | DWG. NO. DS - 302 |
| 6.1(17) | R.C. DRAIN CHUTE FOR R.C. PIPE CULVERT | SQ.M. | -- | DWG. NO. DS - 203 |
| 6.1(18) | PLAIN CONCRETE AT TOE OF R.C. DRAIN CHUTE | SQ.M. | -- | DWG. NO. DS - 203 |
| 6.1(19) | MORTAR R/RAP CATCH BASIN AT INLET FOR R.C. PIPE CULVERT | SQ.M. | -- | DWG. NO. DS - 301 |
| 6.1(20) | PLAIN CONCRETE CATCH BASIN AT INLET FOR R.C. PIPE CULVERT | SQ.M. | -- | DWG. NO. DS - 301 |
| 6.1(21) | DROP INLET FOR R.C.P. DIA. M. ROW | EACH | -- | DWG. NO. DS - 201 |
| 6.1(22) | ROCK | | | |
| 6.1(22.1) | SIZE 8 - 10 CM. | CU.M. | -- | |
| 6.1(22.2) | SIZE 10 - 25 CM. | CU.M. | -- | |
| 6.1(23) | NON - WOVEN GEOTEXTILES, WEIGHT 200 G./SQ.M. (MIN.) | SQ.M. | -- | |
| 6.1(24) | LEAN CONCRETE 1:3:6 BY VOLUME | CU.M. | -- | |
| 6.2 | SUBSURFACE DRAINS | | | |
| 6.2(1) | PREFABRICATED PIPE WITH GEOTEXTILES | M. | -- | |
| 6.2(2) | ROCK FILL WITH CONCRETE SAND | CU.M. | -- | |
| 6.3 | USCELLAREOUS STRUCTURES | | | |
| 6.3(1) | R.C. MANHOLES | | | |
| 6.3(1.1) | TYPE B FOR R.C.P. DIA. 0.80 M. WITH STEEL COVER | EACH | -- | |
| 6.3(1.2) | TYPE B FOR R.C.P. DIA. 0.80 M. WITH STEEL COVER | EACH | -- | |
| 6.3(1.3) | TYPE B FOR R.C.P. DIA. 1.00 M. WITH STEEL COVER | EACH | -- | |
| 6.3(1.4) | TYPE D FOR R.C.P. DIA. 0.80 M. WITH STEEL COVER | EACH | -- | |
| 6.3(1.5) | TYPE D FOR R.C.P. DIA. 0.80 M. WITH RC. COVER | EACH | -- | |
| 6.3(1.6) | TYPE O FOR R.C.P. DIA. 1.00 M. WITH RC. COVER | EACH | -- | |
| 6.3(1.7) | MODIFICATION OF EXISTING MANHOLES WITH COVER | EACH | -- | |
| 6.3(2) | CATCH BASINS | | | |
| 6.3(3) | MEDIAN DROP INLETS | | | |
| 6.3(3.1) | TYPE A FOR R.C.P. DIA. 0.40 M. 1 ROW | EACH | -- | DS-401 |
| 6.3(3.2) | TYPE B (FOR R.C.P. DIA. M. ROW) | EACH | -- | |
| 6.3(3.2.2) | | | | |

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

| | | |
|------------------|------------|--------|
| แนวทางการหลวง | รหัสควบคุม | แผนที่ |
| จุดเริ่มต้นที่ 2 | 0100 | D2 |

SUMMARY OF QUANTITIES

ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100
 ตอน หัวชนอวก - เต็มชาติ
 กม12+263.000 - กม17+000.000

หมายเหตุ :-

- ปริมาณงานที่แสดงไว้ในแบบนี้เป็นปริมาณโดยประมาณเท่านั้น ปริมาณที่ถูกต้องให้ถือปริมาณที่ก่อสร้างจริงในสนาม ปริมาณที่ขาดเกินไปจากที่แสดงไว้ในแบบนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเองโดยทราบดีว่าทุกกรณีทางหลวงไม่รับผิดชอบ
- งาน ROADWAY EXCAVATION AND EMBANKMENT ภาษีค่าขนานที่โครงการ 4 คิดจากมูลค่าดินที่ขุดรวมทั้งงาน CLEARING AND GRUBBING และรูปัดถนนเรียบกับ FINISHED SUBGRADE
- ขนาดและตำแหน่งของท่อระบายน้ำ ที่แสดงไว้ในแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยได้รับความเห็นชอบในสนาม ที่นี้ต้องได้รับทราบที่ขออนุญาตควบคุมงาน
- ปริมาณงานตามรายการนี้เป็นปริมาณงานที่คิดจากพื้นที่ผิวคำนวณ

| ITEM | DESCRIPTION | UNIT | QUANTITIES | REMARK |
|-------------|--|-------|------------|----------------------|
| 6.3(6) | R.C. DITCH | | | |
| 6.3(1) | TYPE A | M. | | |
| 6.3(2) | TYPE B | M. | | |
| 6.3(7) | R.C. CUTTER | M. | | |
| 6.3(10) | DROP INLET FOR BRIDGE DRAINAGE | M. | | |
| 6.3(11) | R.C. U-DITCH LINING TYPE "D" | M. | | |
| 6.3(12) | SIDE DITCH LINING | | | |
| 6.3(12.1) | TYPE I | SQ.M. | | |
| 6.3(12.2) | TYPE II | SQ.M. | | DWG.NO. DS-201 |
| 6.3(12.3) | TYPE III | SQ.M. | | |
| 6.3(13) | CONCRETE DITCH AT HILLSIDE | | | |
| 6.3(13.1) | TYPE A | M. | | |
| 6.3(13.2) | TYPE B | M. | | |
| 6.3(14) | RETAINING WALL | | | |
| 6.3(14.1) | RETAINING WALL TYPE 1B | M. | | DWG.NO. RT-101 |
| 6.3(14.2) | RETAINING WALL TYPE 2A | M. | | DWG.NO. RT-101 |
| 6.3(14.3) | RETAINING WALL TYPE 3A | M. | | DWG.NO. RT-102 |
| 6.3(14.4) | RETAINING WALL - B | | | |
| 6.3(14.4.1) | CHC M. | M. | | DWG.NO. RS-702 |
| 6.3(14.4.2) | CHC M. | M. | | DWG.NO. RS-702 |
| 6.3(14.4.3) | CHC M. | M. | | DWG.NO. RS-702 |
| 6.3(14.5) | CANTILEVER RETAINING WALL | | | |
| 6.3(14.5.1) | CHC M. | M. | | DWG.LABT 267-17/B-9 |
| 6.3(14.5.2) | CHC M. | M. | | DWG.LABT 267-17/B-9 |
| 6.3(14.5.3) | CHC M. | M. | | DWG.LABT 267-17/B-9 |
| 6.4 | CONCRETE CURB AND CUTTER | | | |
| 6.4(1) | BARRIER CURB AND CUTTER | M. | | |
| 6.4(2) | BARRIER CURB | M. | | |
| 6.4(3) | MOUNTABLE CURB AND CUTTER | M. | | |
| 6.4(4) | MOUNTABLE CURB | M. | | |
| 6.4(5) | CONCRETE BARRIERS | | | |
| 6.4(5.1) | TYPE I | M. | | |
| 6.4(5.2) | TYPE I (FOR DEEP CUT AND HIGH FILL) | M. | | |
| 6.4(5.3) | TYPE B | M. | | |
| 6.4(5.4) | AT BRIDGE APPROACH | M. | | |
| 6.4(6) | APPROACH CONCRETE BARRIERS | | | |
| 6.4(6.1) | TYPE A | EACH | | |
| 6.4(6.2) | TYPE B | EACH | | |
| 6.4(6.3) | TYPE C | EACH | | |
| 6.4(6.4) | TYPE D | EACH | | |
| 6.4(6.5) | TYPE E | EACH | | |
| 6.5 | PAVING BLOCK | | | |
| 6.5(1) | CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 x 40 x 4 CM. | SQ.M. | | INCLUDE SAND CUSHION |
| 6.5(2) | CONCRETE PAVING BLOCK UNI - SHAPE 9 CM THICK GREEN COLOUR | SQ.M. | | INCLUDE SAND CUSHION |
| 6.6 | SODDING | | | |
| 6.6(1) | BLOCK SODDING | SQ.M. | | |
| 6.6(2) | STRIP SODDING | SQ.M. | | |
| 6.7 | TOPSOIL AND CLAY | | | |
| 6.7(1) | TOPSOIL | CUM. | | |
| 6.7(2) | CLAY | CUM. | | |
| 6.8 | GUARDRAIL | | | |
| 6.8(1) | SINGLE W-BEAM GUARDRAIL (THICKNESS 2.6 MM CLASS B TYPE I) | M. | | |
| 6.8(2) | CABLE GUARDRAIL | M. | | |
| 6.9 | FENCING AND GATE | | | |
| 6.9(1) | FENCING | M. | | |
| 6.9(2) | GATE | EACH | | |
| 6.10 | MARKER AND GUIDE POST | | | |
| 6.10(1) | GUIDE POST | EACH | | |
| 6.10(2) | KILOMETER STONE | EACH | | |
| 6.10(3) | R.O.M. MONUMENT | EACH | | DWG.NO. RS-114 |
| 6.10(4) | REFLECTING TARGET | | | |
| 6.10(4.1) | TYPE I FOR CURB | EACH | | |
| 6.10(4.2) | TYPE II FOR GUARDRAIL | EACH | | |
| 6.10(4.3) | TYPE III FOR BARRIER | EACH | | |
| 6.11 | TRAFFIC SIGNS | | | |
| 6.11(1) | SIGN PLATE | SQ.M. | | |
| 6.11(2) | SIGN POST | | | |
| 6.11(2.1) | R.O.SIGN POST SIZE 0.12 x 0.12 M. | M. | | DWG.NO. RS-107 |
| 6.11(2.2) | R.O.SIGN POST SIZE 0.18 x 0.18 M. | M. | | 1 EACH = 1 LEG |
| 6.11(2.3) | STEEL PIPE DIA. 90 MM. | EACH | | |
| 6.11(3) | OVERHEAD SIGN BOARD | | | DWG.NO. RS-108 |
| 6.11(3.1) | MOUNTING ON STEEL TRUSS AND STEEL POLE | SQ.M. | | 1 EACH = 1 LEG |
| 6.11(3.2) | MOUNTING AT BRIDGE DECK | SQ.M. | | |
| 6.11(4) | STEEL POLE FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN | | | |
| 6.11(4.1) | RELOCATION OF EXISTING STEEL POLE FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN AT STA. (T.M.) STA. (H) | EACH | | |
| 6.11(4.2) | FOR SIGN PLATE < 2 x 62.800 SQ.M. | EACH | | |
| 6.11(5) | STEEL FRAME FOR MOUNTING OVERHEAD SIGN TYPE I | | | |
| 6.11(5.1) | FOUNDATION AND STEEL POST FOR OVERHEAD SIGN | EACH | | |
| 6.11(5.2) | STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN | M. | | |
| 6.11(6) | STEEL FRAME FOR MOUNTING OVERHEAD SIGN TYPE II | | | |
| 6.11(6.1) | FOUNDATION AND STEEL POST FOR OVERHEAD SIGN | EACH | | |
| 6.11(6.2) | STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN | M. | | |
| 6.12 | ROADWAY LIGHTINGS | | | |
| 6.12(1) | 8.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS CUT-OFF | EACH | | |

| ITEM | DESCRIPTION | UNIT | QUANTITIES | REMARK |
|------------|--|-------|------------|--------|
| 6.12(2) | 8.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS CUT-OFF | EACH | | |
| 6.12(3) | 8.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 400 WATTS CUT-OFF | EACH | | |
| 6.12(4) | 12.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 400 WATTS CUT-OFF | EACH | | |
| 6.12(5) | HIGH MAST WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 400 WATTS | EACH | | |
| 6.12(5.1) | 20.00 M. HIGH WITH LANTERNS | EACH | | |
| 6.12(5.2) | 25.00 M. HIGH WITH LANTERNS | EACH | | |
| 6.12(5.3) | 30.00 M. HIGH WITH LANTERNS | EACH | | |
| 6.12(6) | 2-40 WATTS FLUORESCENT LAMP, CEILING MOUNTED TYPE | EACH | | |
| 6.12(7) | 1-150 WATTS HIGH PRESSURE SODIUM LAMP, BOFFIT LANTERN | EACH | | |
| 6.12(8) | OVERHEAD SIGN LIGHTING | EACH | | |
| 6.12(9) | 250 WATTS HIGH PRESSURE SODIUM LAMP, CUT-OFF ON EXISTING ELECTRIC POLE | EACH | | |
| 6.12(10) | RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS | | | |
| 6.12(10.1) | SINGLE BRACKET (MOUNTING HEIGHT 8.00 M.) | EACH | | |
| 6.12(10.2) | DOUBLE BRACKETS (MOUNTING HEIGHT 8.00 M.) | EACH | | |
| 6.12(10.3) | HIGH MAST (MOUNTING HEIGHT M.) | EACH | | |
| 6.12(11) | TRAFFIC SIGNALS | L.S. | | |
| 6.13 | TRAFFIC SIGNALS | L.S. | | |
| 6.13(1) | TRAFFIC SIGNALS | L.S. | | |
| 6.13(1.1) | AT STA. (CONTROLLER TYPE, PHASES) | L.S. | | |
| 6.13(1.2) | AT STA. (CONTROLLER TYPE, PHASES) | L.S. | | |
| 6.13(2) | IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNALS | | | |
| 6.13(2.1) | AT STA. (FIXED TIME CONTROLLER TYPE, 4 PHASES) | L.S. | | |
| 6.13(2.2) | AT STA. (CONTROLLER TYPE, PHASES) | L.S. | | |
| 6.14 | FLASHING SIGNALS | | | |
| 6.14(1) | FLASHING SIGNALS | EACH | | |
| 6.14(1.1) | AT STA. | EACH | | |
| 6.14(1.2) | AT STA. | EACH | | |
| 6.14(1.3) | AT STA. | EACH | | |
| 6.14(1.4) | AT STA. | EACH | | |
| 6.14(2) | IMPROVEMENT OF EXISTING FLASHING SIGNALS | | | |
| 6.14(2.1) | AT STA. | L.S. | | |
| 6.14(2.2) | AT STA. | L.S. | | |
| 6.14(3) | FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL) | EACH | | |
| 6.15 | MARKINGS | | | |
| 6.15(1) | TRAFFIC PAINT COLD PAINT & HOT PAINT (YELLOW & WHITE) | SQ.M. | | |
| 6.15(2) | THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) | SQ.M. | 1,482 | |
| 6.15(3) | ROAD STUD | | | |
| 6.15(3.1) | UN-DIRECTION | EACH | | |
| 6.15(3.2) | BI-DIRECTION | EACH | | |
| 6.15(4) | CHAFFER BAR (CHAFFER BAR) | EACH | | |
| 6.15(4.1) | UN-DIRECTION | EACH | | |
| 6.15(4.2) | BI-DIRECTION | EACH | | |
| 6.15(5) | RAISED BAR | M. | | |
| 6.15(6) | CURB MARKINGS | SQ.M. | | |
| 6.16 | PERMANENT TRUSS BARRICADE | M. | | |
| 6.17 | BUS STOP SHELTER | | | |
| 6.17(1) | TYPE A | EACH | | |
| 6.17(2) | TYPE B | EACH | | |
| 6.17(3) | TYPE C | EACH | | |
| 6.17(4) | TYPE D | EACH | | |
| 6.17(5) | TYPE E | EACH | | |
| 6.17(6) | TYPE F | EACH | | |
| 6.17(7) | RELOCATION OF EXISTING BUS STOP SHELTER TYPE | EACH | | |
| 6.18 | LANDSCAPING WORK | | | |
| 6.18(1) | TREE PLANTING | | | |
| 6.18(1.1) | SMALL SIZE (DIA. M. HEIGHT M. MIN.) | EACH | | |
| 6.18(1.2) | MEDIUM SIZE (DIA. M. HEIGHT M. MIN.) | EACH | | |
| 6.18(1.3) | LARGE SIZE (DIA. M. HEIGHT M. MIN.) | EACH | | |
| 6.18(2) | GRASS PLANTING | SQ.M. | | |
| 6.18(3) | GROUND COVER PLANTING | SQ.M. | | |
| 6.18(4) | GRASSING | | | |
| 6.18(4.1) | MURBAND | SQ.M. | | |
| 6.18(5) | EARTH FILL FOR LANDSCAPING WORK | CUM. | | |
| 6.19 | BRIDGE DRAINAGE | | | |
| 6.19(1) | GULLY | EACH | | |
| 6.19(2) | GRATING | EACH | | |
| 6.19(3) | PIPE | M. | | |
| 6.19(4) | CATCH BASIN | EACH | | |
| 6.20 | CEMENT MIXED BINDER POLYMERS PAINTING | SQ.M. | | |
| 7 | TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION | L.S. | 1 | |
| 8 | STEEL FIBRECONCRETE BACK SLOPE PROTECTION 0.07 M. THICK | SQ.M. | | |

กรมทางหลวง

| | | |
|---------------------|-------------------|---------------|
| เขียน ทวีชัยรัตน์ | ทวน | 29/5/65 |
| ออกแบบ Mr. M. M. M. | ตรวจ Mr. M. M. M. | รท. รท. รท. 5 |
| เพิ่มขอบ | รท. รท. 5 | 29/5/65 |
| อนุญาต | รท. รท. 5 | 29/5/65 |

ข้อกำหนดและนำสำหรับวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

| | | |
|---------------|------------|--------|
| แนวทางการทวง | รหัสควบคุม | แผนที่ |
| จุดครั้งที่ 2 | 0100 | E |


SPECIFICATION FOR CONSTRUCTION MATERIALS

ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100
 ตอน หัวน้อยกา - เคนซาคี
 กม12+283.000 - กม17+000.000

หมายเหตุ :

- จำนวนบ่งบุน้ำหนัก ภาชนะบรรจุในบรรจุภัณฑ์มีความสูงของถังตามเดิม
- ส่วน "A" ให้อุณหภูมิของดินของอุณหภูมิตามเดิม
- ส่วน "B" กว้างของถังซึ่งใช้บรรจุภัณฑ์สามารถทำกันได้
- ให้ใช้วัสดุ SOL AGGREGATE ซึ่งควร ใช้น้ำหนักของดินของชั้นวัสดุที่เลือกตามแบบ (กรณีที่มีชั้นวัสดุที่เลือกไว้แบบ) ยกเว้น SOFT SPOT หรือ ในกรณีที่วัสดุ AGGREGATE ดังกล่าวถูกจำกัดให้ใช้แบบใดแบบหนึ่ง PROCESS วัสดุที่ใหม่ให้มีความหนาแน่นและระดับตามแบบ
- การพิจารณาว่าดินเดิม SOFT หรือไม่ ให้ใช้วิธีทดสอบโดยใช้ดินที่เก็บไปไม่น้อยกว่า 6 เมตรขึ้นไป และสังเกตในระหว่างที่ ดินเดิมเดิม SOFT จะสังเกตเห็น การยุบตัว (MOVEMENT)
- ระหว่างการทำผิวหน้าของไหล่ทางต้อง อยุ่ห่างจาก ภาชนะบรรจุของดินเดิม และต้องระวังไม่ให้ดินเดิมที่บริเวณความยาว BENCHING เกิดการ CRACK เนื่องจากขาด LATERAL SUPPORT
- บริเวณที่เป็นบ่อขุดดินให้ขุดออก แทนที่ด้วยวัสดุเดิมชั้นบนที่บ่งบุน้ำหนักตามแบบชั้นของดินที่พบ

| SHEET NO. | TYPE | SPECIFICATION |
|-----------|---|--|
| 1 | งานขุดดินทาง ROADWAY EXCAVATION | อ้างอิง " รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง" แผนที่ 1 " |
| 2 | ดินถมคันทาง EARTH EMBANKMENT | อ้างอิง " มาตรฐานดินถมคันทาง " มาตรฐานที่ ทล - ม 102 / 2532 |
| 3 | ทรายถมคันทาง SAND EMBANKMENT | อ้างอิง " มาตรฐานทรายถมคันทาง " มาตรฐานที่ ทล - ม 103 / 2532 |
| 4 | หินถมคันทาง ROCK EMBANKMENT | อ้างอิง " มาตรฐานหินถมคันทาง " มาตรฐานที่ ทล - ม 104 / 2532 |
| 5 | วัสดุเคลือบ "A" SELECTED MATERIAL "B" | อ้างอิง " มาตรฐานชั้นวัสดุเคลือบ "A" " มาตรฐานที่ ทล - ม 209 / 2532 |
| 6 | วัสดุเคลือบ "A" SELECTED MATERIAL "A" | อ้างอิง " มาตรฐานชั้นวัสดุเคลือบ "A" " มาตรฐานที่ ทล - ม 208 / 2532 |
| 7 | รองพื้นทางวิธฐานรวม SUBBASE | อ้างอิง " มาตรฐานรองพื้นทางวิธฐานรวม " มาตรฐานที่ ทล - ม 205 / 2532 |
| 8 | รองพื้นทางหินชั้น SOIL CEMENT SUBBASE | อ้างอิง " มาตรฐานรองพื้นทางหินชั้น " มาตรฐานที่ ทล - ม 206 / 2584 |
| 9 | ทรายรองพื้นคอนกรีต SAND CUSHION | อ้างอิง " มาตรฐานชั้นทรายรองพื้นคอนกรีต " มาตรฐานที่ ทล - ม 211 / 2533 |
| 10 | ชั้นทางหินตก BASE | อ้างอิง " มาตรฐานชั้นทางหินตก " มาตรฐานที่ ทล - ม 201 / 2544 |
| 11 | หินทางหินตกชั้นหินที่ CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE | อ้างอิง " มาตรฐานหินทางหินตกชั้นหินที่ " มาตรฐานที่ ทล - ม 203 / 2556 |
| 12 | หินทางหินชั้น SOIL CEMENT BASE | อ้างอิง " มาตรฐานหินทางหินชั้น " มาตรฐานที่ ทล - ม 204 / 2584 |
| 13 | หินตกของดินคอนกรีต CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE | อ้างอิง " มาตรฐานชั้นหินตกของดินคอนกรีต " มาตรฐานที่ ทล - ม 212 / 2533 |
| 14 | การนำดินชั้นวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้ในงานใหม่ PAVEMENT RECYCLING | อ้างอิง " มาตรฐานการนำดินชั้นวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้ในงานใหม่ " มาตรฐานที่ ทล - ม 213 / 2543 |
| 15 | ถนนปูนซีเมนต์คอนกรีต PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT | อ้างอิง " มาตรฐานถนนปูนซีเมนต์คอนกรีต " มาตรฐานที่ ทล - ม 309 / 2544 |
| 16 | การซ่อมแซมคอนกรีตในถนนคอนกรีตด้วยวัสดุซ่อมแซมชนิดพิเศษ | อ้างอิง " มาตรฐานการซ่อมแซมคอนกรีตในถนนคอนกรีตด้วยวัสดุซ่อมแซมชนิดพิเศษ " มาตรฐานที่ ทล - ม 321 / 2532 |
| 17 | การปิดรอย (RESEALING) วัสดุอุดรอยชนิดพิเศษ | อ้างอิง " มาตรฐานการปิดรอย (RESEALING) วัสดุอุดรอยชนิดพิเศษ " มาตรฐานที่ ทล - ม 324 / 2543 |
| 18 | การแก้ไขรอยร้าวที่ลึกถึงชั้นคอนกรีต FULL - DEPTH REPAIR | อ้างอิง " มาตรฐานการแก้ไขรอยร้าวที่ลึกถึงชั้นคอนกรีต FULL - DEPTH REPAIR " มาตรฐานที่ ทล - ม 326 / 2544 |
| 19 | การอุดรอยโพรงใต้แผ่นพื้นคอนกรีต SUBSEALING | อ้างอิง " มาตรฐานการอุดรอยโพรงใต้แผ่นพื้นคอนกรีต (SUBSEALING) " มาตรฐานที่ ทล - ม 327 / 2543 |
| 20 | การซ่อมแซมผิวระหว่างไหล่ทางกับผิวทางคอนกรีต ด้วยวัสดุอุดรอยชนิดพิเศษ | อ้างอิง " มาตรฐานการซ่อมแซมผิวระหว่างไหล่ทางกับผิวทางคอนกรีต ด้วยวัสดุอุดรอยชนิดพิเศษ " มาตรฐานที่ ทล - ม 328 / 2544 |
| 21 | การทาผิวชั้น PRIME COAT | อ้างอิง " มาตรฐานการทาผิวชั้น PRIME COAT " มาตรฐานที่ ทล - ม 402 / 2557 |
| 22 | การทาผิวชั้น TACK COAT | อ้างอิง " มาตรฐานการทาผิวชั้น TACK COAT " มาตรฐานที่ ทล - ม 403 / 2531 |
| 23 | ผิวสัมผัสเพื่อผิวชั้นที่ SURFACE TREATMENT | อ้างอิง " มาตรฐานผิวสัมผัสเพื่อผิวชั้นที่ (SURFACE TREATMENT) " มาตรฐานที่ ทล - ม 401 / 2533 |
| 24 | การฉาบผิวทางแบบ SLURRY SEAL | อ้างอิง " มาตรฐานวิธีการฉาบผิวทางแบบ SLURRY SEAL " มาตรฐานที่ ทล - ม 405 / 2542 |
| 25 | การฉาบผิวทางแบบ PARA SLURRY SEAL | อ้างอิง " มาตรฐานวิธีการฉาบผิวทางแบบพาราสลอรี่ซีล (PARA SLURRY SEAL) " มาตรฐานที่ ทล - ม 415 / 2546 |
| 26 | ผิวทางแบบ CAPE SEAL | อ้างอิง " มาตรฐานผิวทางแบบแคปซีล (CAPE SEAL) " มาตรฐานที่ ทล - ม 411 / 2542 |
| 27 | แอสฟัลต์คอนกรีต ASPHALT CONCRETE | อ้างอิง " มาตรฐานแอสฟัลต์คอนกรีต " มาตรฐานที่ ทล - ม 408 / 2532 |
| 28 | งานซ่อมผิวทางแบบ PATCHING | อ้างอิง " มาตรฐานงานซ่อมผิวทางแบบ PATCHING " มาตรฐานที่ ทล - ม 451 / 2544 |
| 29 | งานซ่อมผิวทางแบบ DEEP PATCHING | อ้างอิง " มาตรฐานงานซ่อมผิวทางแบบ PATCHING " มาตรฐานที่ ทล - ม 452 / 2544 |
| 30 | เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ROAD MARKING | อ้างอิง " รายละเอียดและข้อกำหนดการขีดเส้นจราจรบนพื้นทาง (การขีดเส้น ลูกศร ขีดเขียนขีดขวาง) ฉบับเดือน กรกฎาคม 2551 " |
| 31 | งานสีขี้นทางเดิม และก่อสร้างใหม่ REPAINTING & RECONSTRUCTION OF EXISTING PAVEMENT | อ้างอิง " รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง แผนที่ 1 " |

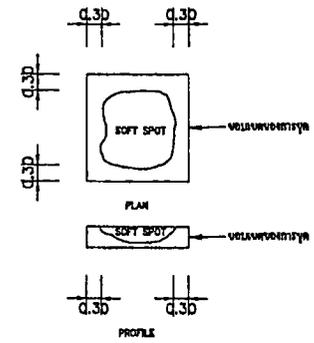

รูปแบบการแก้ไขบริเวณจุดอ่อนผิว (SOFT SPOT)

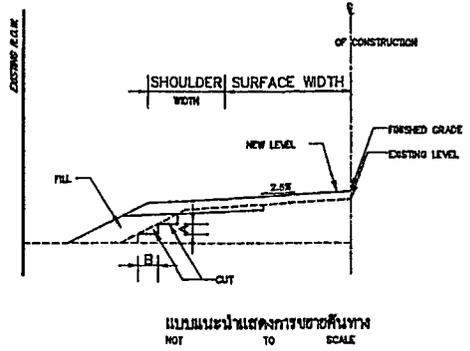


TABLE SLOPE FOR CUT AND FILL

| HEIGHT OF CUT OR FILL | EARTH | | SOFT ROCK | | HARD ROCK | |
|-----------------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| | CUT | FILL | CUT | FILL | CUT | FILL |
| 0.00 M. TO 1.00 M. | 2:1 | 2:1 | 1 1/2:1 | 2:1 | 1 1/2:1 | 1 1/2:1 |
| 1.00 M. TO 3.00 M. | 2:1 | 2:1 | 1 1/2:1 | 1 1/2:1 | 1:1 | 1:1 |
| 3.00 M. TO 8.00 M. | 1 1/2:1 | 1 1/2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |

REMARKS
 SPECIFICATION FOR CONSTRUCTION MATERIAL USED
 VOID

| กรมทางหลวง | | |
|-----------------|--------------|------------|
| เขียน ทัศนรัตน์ | ทวน | OK |
| ออกแบบ Mr. Man | ตรวจ Mr. Man | ท.ว.บ.ท.5 |
| เห็นชอบ | OK | 29/ค.ค./65 |
| อนุญาต | W. Naim | 29/ค.ค./65 |

รายละเอียดต่อท้ายสัญญา เลขที่ อต.๒/ม.๒/๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์

รายละเอียดต่อสัญญา ฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ อต.๒/ม.๒/๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|--|
| ๑. งานขุดรื้อพื้นทางและไหล่ทางทั้งสองข้าง | ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมทางหลวงกำหนด |
| ๒. งาน TACK COAT | ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.๔๐๓/๒๕๓๑ |
| ๓. งาน ASPHALT CONCRETE | ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.๔๐๘/๒๕๓๒ |
| ๔. งานตีเส้นบนทางหลวง | ให้เป็นไปตามรายการละเอียดและข้อกำหนดการ จัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง |

๕. เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทก่อสร้างสูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้นี้
ให้เป็นไปตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายสัญญา

๖. วิธีการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างได้มีเวลาจัดเจ้าหน้าที่ที่จะควบคุมงาน และเตรียมการควบคุม
ตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ ให้สอดคล้องและไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างเสนอแผน
ระยะเวลาที่จะดำเนินงาน (Time Schedule) ในสายทางต่าง ๆ ให้ผู้ว่าจ้าง ทราบและให้ความเห็นชอบก่อนการ
ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗ วัน

๗. การควบคุมการจราจร

๗.๑ เนื่องจากงานตามสัญญานี้ จะต้องดำเนินการในสายทางที่เปิดการจราจรอยู่แล้ว ฉะนั้น
เพื่อมิให้การจราจรหยุดชะงัก ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการครั้งละครั้งหนึ่งของความกว้างของผิวทาง เว้นอีกครึ่งหนึ่งไว้เพื่อ
การจราจร และภายหลังจากที่ได้เปิดให้การจราจรผ่านบนครั้งที่ดำเนินการเสร็จได้เป็นปกติแล้ว จึงดำเนินการอีก
ครึ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำต่อไป เว้นไว้แต่ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ว่าจ้างมอบหมายจะสั่งเป็นอย่างอื่น

๗.๒ ในช่วงระยะตั้งแต่ผู้รับจ้างปิดการจราจรเพื่อดำเนินงานตามประกาศ ณ ช่วงใดตลอดไป
จนถึงระยะเวลาที่ช่างควบคุมงานได้อนุมัติให้เปิดการจราจรให้เดินได้ในอัตราความเร็วปกติ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง
ที่จะต้องทำ ปัก จัด วางป้ายเครื่องหมายจราจร ตลอดจนจัดให้มีคนให้สัญญาณการจราจร และโคมไฟแสดงสัญญาณ
จราจรในเวลากลางคืน ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง โดยได้รับความเห็นชอบจากช่างควบคุมงาน เพื่อให้การจราจร
ผ่านไปมาได้โดยสะดวกและปลอดภัย ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติให้
ถูกต้องตามเงื่อนไขในข้อนี้

๘. รายละเอียดเพิ่มเติม

๘.๑ เนื่องจากผิวทางตามระยะกิโลเมตรที่แสดงในบัญชีสายทาง และระยะทาง แนบสัญญาอาจจะ
มีบางส่วนที่ยังมีลักษณะยังไม่ต้องการก่อสร้างหรือมีบางส่วนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นต้องการ ก่อสร้าง ช่าง
ควบคุมงานอาจสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้งดเว้นดำเนินการส่วนที่ไม่จำเป็น และให้ดำเนินการในส่วน ที่จำเป็น โดยที่
เมื่อรวมปริมาณงานทั้งหมดแล้ว ไม่เกินปริมาณงานที่ระบุในสัญญาได้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ

.....
ผู้ว่าจ้าง

.....
ผู้รับจ้าง

/ ตามคำสั่ง....

ตามคำสั่งของช่างควบคุมงาน โดยผู้รับจ้าง จะยกเอาการงดเว้นดำเนินการบางตอนและสั่งให้ดำเนินการบางตอน ภายในจำนวนปริมาณงานดังกล่าวข้างต้นขึ้นมาเป็นข้อเรียกร้องให้กรมทางหลวงชดใช้ค่าเสียหายอย่างใดแก่ผู้รับจ้าง มิได้

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงช่วงที่จะทำการก่อสร้างตามวรรคแรกจะกระทำไม่เกินด้านละ ๕ กิโลเมตร จากช่วงที่ระบุไว้ในสัญญา เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญา

๘.๒ ผู้รับจ้างยินยอมให้ช่างควบคุมงานเข้าตรวจตราดูแลการทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ และถ้าช่างควบคุมงานได้สั่งการให้ผู้รับจ้าง ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญานี้ เพื่อประโยชน์แก่ราชการของผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมงานทุกประการ ถ้าผู้รับจ้างละเลยไม่ปฏิบัติตาม ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างได้

๘.๓ ถ้าการทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญานี้เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายด้วยเหตุละเมิดหรือเหตุใดก็ตาม และกรมทางหลวงต้องเสียค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไปเพื่อความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวนี้เป็นจำนวนเงินเท่าใดก็ดี ผู้รับจ้างยอมชดใช้แทนกรมทางหลวงทั้งสิ้น

๙. ข้อกำหนดงานสีเทอร์โมพลาสติก


- ก่อนดำเนินการตีเส้นจราจร ผู้รับจ้างจะต้องทำการกองสต็อกสีที่จะใช้ตีเส้นจราจร ณ หมวดทางหลวงใกล้เคียงโครงการ และผู้ควบคุมงานหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพวัสดุจะสุ่มเก็บตัวอย่างสีส่งทดสอบที่ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก)

- เมื่อผลการทดสอบผ่านแล้ว ผู้ควบคุมงานจะลงชื่อกำกับถุงสีทั้งหมด และอนุญาตให้ผู้รับจ้างนำสีจากกองสต็อกไปใช้ตีเส้นจราจรได้ แล้วจะต้องนำถุงสีที่ใช้แล้ว กลับมาเก็บที่กองสต็อกดั้งเดิม



- หากผลการทดสอบไม่ผ่านข้อกำหนด หรือสีมีปริมาณลูกแก้วต่ำกว่าที่กำหนด จะไม่อนุญาตให้นำสีจากกองสต็อกทั้งหมดมาใช้ตีสีเส้นจราจร และผู้รับจ้างจะต้องนำสีมากองสต็อกใหม่ และทำการเก็บตัวอย่างและส่งทดสอบใหม่ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น

- การทดสอบสีเทอร์โมพลาสติกจะทำการทดสอบหาปริมาณลูกแก้วที่ผสมในเนื้อสี ตามมาตรฐาน มอก.๕๔๒-๒๕๔๙ วัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง สำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง และตามข้อกำหนดวัสดุงานทาง ทล.-ก.๖๐๔/๒๕๒๕ วัสดุเทอร์โมพลาสติกสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง

- สีเทอร์โมพลาสติก จะต้องมีความเป็นสีเหลือง ตามแถบสีมาตรฐาน ๑๓๕๓๘ ตาม FED-STD ๕๙๕B



ผู้ว่าจ้าง



ผู้รับจ้าง

รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
หรือความเสียหายภายในกำหนดเวลา

สัญญา เลขที่..... อต.๒/ม.๒/๔/๒๕๖๖ ลงวันที่..... ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑. ภายในกำหนดเวลา ๒ ปี

ผู้รับจ้าง ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างกับกรมทางหลวง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างตามเงื่อนไขที่กำหนดภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมทางหลวงได้รับมอบงาน ยกเว้นงานจ้างตามข้อ ๒ และ ข้อ ๓


๒. ภายในกำหนด ๑ ปี

- ๒.๑ งานคันทางดิน (ถนนดิน)
- ๒.๒ งานผิวทางลูกรัง
- ๒.๓ รางระบายน้ำที่ไม่ตาดคอนกรีต (Concrete)
- ๒.๔ ไหล่ทางลูกรัง
- ๒.๕ ลาดข้างทางและลาดคอสะพานที่ไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ
- ๒.๖ ลาดดินตัด (BACK SLOPE) ที่ไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ
- ๒.๗ งานปลูกหญ้า
- ๒.๘ งานปลูกต้นไม้
- ๒.๙ งานตีเส้นโดยใช้สีชนิดโรยลูกแก้ว
- ๒.๑๐ งานทาสีทั่วไป

๓. ภายในกำหนด ๓ ปี

- ๓.๑ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ยกเว้นหลอดไฟฟ้า


.....
ผู้ว่าจ้าง


.....
ผู้รับจ้าง

TRACKO
COMPANY LIMITED


เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน

.....


ภายในกำหนดระยะเวลา.....๗.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการทำงาน ส่งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและแผนการทำงานดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนจึงจะลงมือทำงานได้

แผนการทำงานจะต้องแสดงลำดับขั้นตอนและช่วงเวลาที่ทำงานแต่ละรายการตามสัญญาให้ครบถ้วนชัดเจนและเป็นไปได้ โดยงานทั้งหมดต้องแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดเวลาของสัญญา

ในกรณีมีความจำเป็นต้องปรับแผนการทำงานในระหว่างการทำงาน ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการทำงานที่ปรับเปลี่ยนแก่ผู้ว่าจ้างเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง



ผู้ว่าจ้าง



ผู้รับจ้าง

เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง

ในการเบิกจ่ายค่างานผิวทาง ต้องมีผลการตรวจสอบความเรียบผิวทาง (Surface Tolerance) ด้วยเครื่องมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler) โดยส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงในพื้นที่ที่โครงการฯ ตั้งอยู่ และในการตรวจวัดจะต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index, IRI) ดังนี้

| ลักษณะทางเรขาคณิต | ค่าดัชนีความขรุขระสากล, IRI (m/km) | |
|---|------------------------------------|---------------------|
| | ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต | ผิวจราจร คอนกรีต |
| ทางตรง ทางทั่วไป | ≤ ๒.๕ | ≤ ๒.๕ |
| ทางโค้งกวนและลาดชัน R<๕๐ ม. และ สะพานกลับรถ | ยกเว้นการวัด | ยกเว้นการวัด |


.....
ผู้ว่าจ้าง


.....
ผู้รับจ้าง



แบบแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง

แบบแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำและติดตั้ง ตามมติ ครม.

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑



ประกาศ

ชื่อหน่วยงาน.....

ที่อยู่.....

งานก่อสร้าง.....

ลักษณะงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง บริษัท

ที่อยู่ โทร

สัญญาเลขที่.....เริ่มต้น.....สิ้นสุด.....

ระยะเวลาก่อสร้าง.....วัน

วงเงินค่าก่อสร้าง.....บาท

ผู้ควบคุมงาน ๑. โทร

๒. โทร

๓. โทร

สำนักงานสนาม/เบอร์โทรติดต่อ

โทร โทรสาร

เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง

๑. โทร

๒. โทร

งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน

IRAKO
COMPANY LIMITED

หมายเหตุ

๑. งานก่อสร้างขนาดเล็ก แผ่นป้ายขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร ขนาดอักษรโตพอสมควรเห็นได้ชัดเจน

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา

สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) มีอำนาจในการพิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา งานก่อสร้างและบำรุงทาง สำหรับงานจัดจ้างของทุกหน่วยงานของกรมทางหลวง ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

งานก่อสร้างทาง งานก่อสร้างสะพาน งานปรับปรุงย่านชุมชน งานลาดยางทางหลวง งานลาดยางสายสั้น งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อ การท่องเที่ยว งานเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานปรับปรุงทางหลวง งานบูรณะทางสายหลัก งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบน ทางหลวง งานก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ งานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง และงานอื่น ๆ ตามที่ กรมทางหลวงเห็นสมควร

๑. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญากับกรมทางหลวงไม่มาลงนามในสัญญาภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ หน่วยงานเจ้าของงานมีหนังสือแจ้งให้ทราบ
๒. ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควร จะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา ยกเว้นเมื่อ งานที่เหลือนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาในเวลาอันใกล้ และผลงานที่แล้วเสร็จในขณะนั้นต้องไม่น้อยกว่า ๙๐% ของงานที่ คาดว่าจะทำจริง
๓. ภายในระยะเวลารับประกันผลงาน ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานภายในระยะเวลา ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
๔. กรณีผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างโดยผู้รับจ้างไม่คืนเงินค่า K หรือเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ระหว่างประเทศ ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
๕. ผู้รับจ้างที่กรมทางหลวงได้บอกเลิกสัญญา หรืออยู่ในระหว่างที่หน่วยงานเจ้าของงานขออนุมัติบอกเลิกสัญญา โดยเป็น ความผิดของผู้รับจ้าง จะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา
๖. ผู้รับจ้างมีจำนวนโครงการก่อสร้างครบตามสิทธิการเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนฯ
๗. กรณีที่เป็นงานในลักษณะพิเศษหรืองานเร่งด่วนตามประกาศประกวดราคา ผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๕% โดย เป็นความผิดของผู้รับจ้าง
๘. ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
๙. ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕% ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิด ของผู้รับจ้าง
๑๐. ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน และมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อเวลา ล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง

งานบำรุงทาง

๑. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญากับกรมทางหลวงไม่มาลงนามในสัญญา ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ หน่วยงานเจ้าของงานมีหนังสือแจ้งให้ทราบ
๒. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการภายในระยะเวลาที่หน่วยงานเจ้าของงานกำหนด แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มต้นตาม สัญญา โดยมีได้เป็นความผิดของหน่วยงานเจ้าของงาน
๓. ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควร จะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา ยกเว้นเมื่อ งานที่เหลือนั้น คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาในเวลาอันใกล้ และผลงานที่แล้วเสร็จในขณะนั้นต้องไม่น้อยกว่า ๙๐% ของงานที่ คาดว่าจะทำจริง
๔. ภายในระยะเวลารับประกันผลงาน ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานภายในระยะเวลาตามที่ ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
๕. กรณีผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างโดยผู้รับจ้างไม่คืนเงินค่า K หรือเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ระหว่างประเทศ ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
๖. ผู้รับจ้างที่กรมทางหลวงบอกเลิกสัญญา หรืออยู่ในระหว่างที่หน่วยงานเจ้าของงานขออนุมัติบอกเลิกสัญญา โดยเป็นความผิด ของผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง
